

## ДОГОВОР

за обществена поръчка за строителство

Рег. № ..... 3 ..... от 08.02.2019

Днес, 08.02.2019, в град Смядово, между:

### ОБЩИНА СМЯДОВО

с адрес гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2, код по Регистър БУЛСТАТ 000931657, представлявана от Иванка Николова в качеството ѝ на кмет на община Смядово и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС Радко Чернаков, главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

### „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, ЕИК 202357469 / код по Регистър БУЛСТАТ BG202357469, представлявано от Десислав Герданов в качеството на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 640 от 13.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу уговореното възнаграждение и при условията на Договора строителни и монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово:

- Подобект: „ул. Априлско въстание (от ул. Илия Блъсков до ул. Априлско въстание А) с дължина на подлежащия на реконструиране водопровод 440м.
- Подобект: „ул. Иван Вазов“ с дължина на подлежащия на реконструиране водопровод 181м.
- Подобект: „ул. Райна Княгиня“ с дължина на подлежащия на реконструиране водопровод 375м.
- Подобект: „ул. Захари Величков“ с дължина на подлежащия на реконструиране водопровод 732м.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва строителните и монтажните работи съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба инвестиционни проекти и изискванията на Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 2.** В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в

хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.  
- Неприложимо

### СРОК НА ДОГОВОРА СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 3. (1)** Договорът се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни и ще остане обвързващ за страните до изтичане на минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, освен ако не бъде прекратен по-рано по предвидения в договора ред.

**(2)** Изпълнението на Договора започва, след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включително частично, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 4. (1)** Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи предмет на договора е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва на датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.).

**(3)** Срокът по предходната алинея се спира в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на планираните работи, съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя или изискванията в Техническите спецификации.

**(4)** Срокът за изпълнение се спира с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.). След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството (Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.).

**Чл. 5.** Мястото на изпълнение на Договора е гр. Смядово, община Смядово, Република България.

### ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 6. (1)** Цената за изпълнение на строителните и монтажните работи - предмет на договора, е в размер на **635 037,30 лв.** (*шестстотин тридесет и пет хиляди тридесет и седем лева и тридесет стотинки*) без включен ДДС, съответно **762 044,76 лв.** (*седемстотин шестдесет и две хиляди четиридесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки*) с включен ДДС, в това число до 2 (две) на сто непредвидени разходи, а именно **12 700,75 лв.** (*дванадесет хиляди и седемстотин лева и седемдесет и пет стотинки*) без включен ДДС, съответно **15 240, 90 лв.** (*петнадесет хиляди двеста и четиридесет лева и деветдесет стотинки*) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

**(2)** Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове работи и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали,

строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания, отстраняване на всички недостатъци по работите и отстраняване на дефекти, проявили се през гаранционния срок и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и непредвидени разходи.

(3) Единичните цени за изпълнение на строителни и монтажни работи, посочени в количествените и стойностните сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

**Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

1. Междинни плащания, за действително извършени и приети строителни и монтажни работи, в размер общо до 90 (деветдесет) на сто от цената на Договора;

2. Окончателното плащане, в размер на остатъка от Цената на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност равна на стойността на дължимото плащане за изпълнените и приети работи. Към всяка фактура, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага съответните протоколи към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., в зависимост от вида на работите, и протокол/и за приемане на извършени и подлежащи на заплащане строителни работи, от които е видно начина на образуване на стойността на дължимото плащане, определено въз основа на количествата и изпълнените работи и единичните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Плащанията се извършват по банков път в срок до 30 ( тридесет) работни дни след получаване на документите, необходими за извършване на плащане, в съответствие със сроковете установени в чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. Плащанията се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

ИВАН: Заличено на основание  
чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

ВІС: Заличено на основание  
чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

Обслужваща банка: Заличено на основание  
чл. 62, ал. 2 от ЗКИ

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени относно банковата сметка в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да одобри по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи включени в предмета на Договора. В този случай допълнително необходимите количества по видове работи се доказват с измерване на място и с протокол между страните, които се заплащат по предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати при доказана необходимост до 2 (две) на сто непредвидени разходи за допълнителни количества и/или нови строителни и монтажни работи, които разходи са включени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С цел избягване на съмнение непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

Елементи на ценообразуване за видовете строителни и монтажни работи са както следва:  
Средна часова ставка за ръководния персонал: 5 лв./час;  
Средна часова ставка за квалифицирани работници: 5 лв./час;  
Средна часова ставка за неквалифицирани работници: 5 лв./час;  
Допълнителни разходи върху труд: 90 %;  
Допълнителни разходи върху механизация: 30%;  
Доставно-складови разходи: 10 %;  
Печалба: 10 %.

**Чл. 8. (1)** Когато за частта от предмета на договора, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена отделно от изпълнението на останалите дейности, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от дейностите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. – Неприложимо.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.– Неприложимо.

**(3)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от предмета на договора и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок от 10 (десет) работни дни получаване на документите, необходими за извършване на плащането, и в съответствие със сроковете установени в чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа. – Неприложимо.

#### ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 9.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от Стойността на Договора без ДДС, а именно 19 051,12 (деветнадесет хиляди петдесет и един лева и дванадесет стотинки) лева „Гаранцията за изпълнение“, която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора.

**Чл. 10. (1)** В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

**(2)** Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 11 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора.

**Чл. 11.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ИВАН: **Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ** ВИС: **Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ** Обслужваща банка: **Заличено на основание чл. 62, ал. 2 от ЗКИ** клон Смядово

**Чл. 12. (1)** Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 13. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползвачо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 14. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на дейностите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 3 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответна част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 16.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 15 (петнадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато дейностите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

**Чл. 17.** Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 18.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от Договора.

**Чл. 19.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

#### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 20.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

#### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

**Чл. 22.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да спазва нормативните изисквания и законосъобразните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или лицето, упражняващо независим строителен надзор.
2. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникването на обективни причини, забавящи или правещи невъзможно изпълнението на работите, както и да изисква неговото съдействие или становище по възникнал проблем.
3. Да съгласува изпълнението на работите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицето, упражняващо независим строителен надзор.
4. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Да изпълнява мерките и препоръките на отговорните институции и експлоатационни дружества.
6. Да отстранява за своя сметка всички некачествено извършени работи, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. Да изготви окончателен доклад за извършената работа, съобразно възложеното по Договора.

8. Да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и.

9. Да отстрани в срокове, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за собствена сметка допуснати грешки или пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 23. (1).** При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. При изпълнение на строителните и монтажните работи предмет на договора да спазва действащите нормативни актове в областта на строителството, опазване на околната среда и управление на отпадъците, здравословни и безопасни условия на труд, действащите български държавни стандарти и други относими към предмета на поръчката актове.

2. Да изпълни строителните и монтажните работи предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила и нормативи за съответните дейности и съобразно неговото Техническо предложение, както и в съответствие с одобрените и съгласувани инвестиционни проекти.

3. Да доставя и влага в строежите/обектите висококачествени материали и строителни изделия, определени в инвестиционните проекти. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, техническите проекти, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, относно тези видове документи.

4. Да доставя за своя сметка материалите за строителството и оборудването, необходими за изпълнение предмета на поръчката.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строителните и монтажните работи, вложените материали или технологично оборудване не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените работи.

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение № 12 към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дава писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му.

8. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на обектите.

9. Да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

10. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. Да изпълнява работите с технически правоспособни лица, когато това се изисква.

12. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените работи.

13. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта работи и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време.

14. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за издаване на разрешения за ползване на обекта/ите, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с Техническото предложение и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на лицето, упражняващо независим строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена екзекутивна документация отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя.

15. От датата на започване на строителните и монтажните работи до момента на окончателното приемане на обектите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените работи, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество при изпълнение на поръчката.

17. След приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап да предаде строителните площадки и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци.

18. Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на градското обзавеждане, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното.

19. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на работите и извършване на необходимите проби, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

20. Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата.

21. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (когато е приложимо) като за свои действия, бездействия и работа.

22. Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост, с оглед спазване сроковете по настоящия договор, както и в срок от 10 работни дни, да допълни същата, до определения размер, при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката при възникване на обстоятелства, посочени по-долу в настоящия договор.

23. Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предписания при условията и по реда на настоящия Договор.



24. Да отстрани за своя сметка, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни и монтажни работи.

25. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежите на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор.

26. Да съдейства на националните компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ свързани с разходването на средствата по този Договор.

27. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор.

28. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга на строежа съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ.

29. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени.

30. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

31. Да охранява обектите за своя сметка до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в срок до 5 (пет) календарни дни след края на всеки месец, доклад (отчет) за текущото изпълнение на работите по предмета на договора, както и срещнатите трудности и необходимото съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Докладът по ал. 2 трябва да съдържа следната основна информация: посочване на действително изпълнените дейности, количества и видове работи, в т. ч. процентния им размер спрямо договорения общ обем по обекти; стойностен отчет за текущо изпълнените и подлежащи на разплащане видове работи, в съответствие с договорения начин на плащане; планирани за следващия отчетен период дейности за изпълнение.

(4) За извършването на отделните строителни и монтажни работи съгласно приетия график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(5) За да се удостовери качествено извършване на предвидените работи се извършват необходимите функционални тестове, проверки, контролни измервания, единични и комплексни изпитвания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложими за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(6) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лабораторни, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност.

(7) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 24. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

(3) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на Договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 56 от Договора.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не променя състава на екипа, който ще отговаря за изпълнението на договора, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. – Неприложимо.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. – Неприложимо.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените работи, вляганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обектите/подобектите, предмет на поръчката и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативни актове.

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на офериранияте от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

6. Да откаже заплащане на изпълнени и приети работи, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и застраховката „Трудова злополука“, до отстраняване на нарушението.

**Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. Да заплати цената на договора по реда и при условията в него.

2. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г.).

3. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството.

4. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до подобектите, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

5. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.

6. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при условие, че е изпълнена точно.

7. В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 27.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат смърт или злополука, на което и да било физическо лице на някой обект, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

#### **КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО. ЗАСТРАХОВКИ**

**Чл. 28. (1)** Извършването на строителните и монтажните работи, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно инвестиционния проект, изискванията, определени в Техническите спецификации, както и всички приложими законови разпоредби.

(2) Контролът по изпълнението на строителните и монтажните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката.

(3) Преди започване на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури лице, което упражнява независим строителен надзор.

(4) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа /заповедната книга/ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качествено изпълнение на поръчката. В рамките на гаранционните срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изпълнените работи - предмет на настоящия Договор.

**Чл. 29.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копия на застраховки „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и „Трудова злополука“, съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“. Същият носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на Обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

#### **ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 30. (1)** При завършване на работата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Извършените работи се приемат с протокол/и за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане работи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувани от лицето, упражняващо независим строителен надзор, проектанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Протоколът/ите по предходната алинея се придружават от подробна/и количествена/и сметка/и (ведомости), придружена/и от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост,

(4) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица. Същите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на работите по предмета на договора и следва да са придружени с надлежни доказателства за качеството на извършваните работи (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от лабораторни проби и др., според естеството на работите).

**Чл. 31.** Одобрените и допустими непредвидени разходи съгласно условията на настоящия договор, ще се доказват със следните документи:

1. Обосновка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласувана от лицето, упражняващо строителен надзор, детайлно изясняващо обстоятелствата наложили извършването на допълнителни непредвидени строителни и монтажни работи.

2. Подробни количествени и стойностни сметки, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от лицето, упражняващо независим строителен надзор и проектанта.

3. Становище от проектанта, упражняващ авторски надзор, относно допустимостта и обосноваването на извършването на непредвидени разходи.

4. Заповед за изменение на количествено-стойностна сметка (вариационна заповед), книга на обекта, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, одобрена от лицето, упражняващо независим строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Всички придружаващи строителния процес актове и протоколи, удостоверяващи че са постигнати изискванията на проекта, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство и според изискванията на ЗУТ, имащи пряко отношение към заявените и изпълнени непредвидени разходи.

6. Протокол за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане непредвидени разходи, изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от лицето, упражняващо независим строителен надзор, проектанта упражняващ авторски надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

**Чл. 32. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на документите по чл. 30, съответно чл. 31 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършва проверки за съответствието на заявените в документите данни с реално извършените на обекта.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже да одобри някой от документите по чл. 30 и/или чл. 31, той представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивирано писмено становище за отказа си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 33. (1)** Предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.

(2) В срок от 5 (пет) работни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3,

т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и получаване на окончателния доклад от страна на лицето, упражняващо строителен надзор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

**Чл. 34.** За окончателно приемане на изпълнението на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита издаването на Разрешение за ползване на обекта.

#### **САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 35.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

**Чл. 36.** При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 (нула цяло едно) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет) на сто от Цената по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи предявената неустойка от последното плащане по Договора.

**Чл. 37.** При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0, 1 (нула цяло едно) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 (пет) на сто от Цената по Договора.

**Чл. 38.** При некачествено, неточно и/или частично извършване на строителни и монтажни освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойки в размер на 5 (пет) на сто от стойността на некачественото, неточното и/или частичното извършените работи.

**Чл. 39.** При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското право.

**Чл. 40.** Неустойки по този договор се дължат независимо от прекратяването и развалянето му.

**Чл. 41.** Плащането на неустойките не освобождава страните от изпълнение на съответните задължения.

**Чл. 42.** Неустойките и санкциите по този договор до уговорения размер могат да се удържат от всяко едно от дължимите по договора плащания, както и от гаранцията за изпълнение.

#### **НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 43.** Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.

**Чл. 44.** Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

**Чл.45.** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването им да уведоми другата страна в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

**Чл. 46. (1)** При спиране на строителството вследствие на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение се увеличава със срока на спирането. Спирането на изпълнението се оформя със съответни актове.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непредвидените обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

#### **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 47. (1)** Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. след изтичане на тримесечен срок от сключването му и липса на осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие.

**Чл. 48. (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на отправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на договора в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на договора за повече от 15 (петнадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката/ Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

**Чл. 49.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

**Чл. 50.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания.

**Чл. 51.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред дейности.

## ПЕРСОНАЛ

**Чл. 52. (1)** За изпълнение предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, посочени в офертата, неразделна част от този договор.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя инициатива предлага смяна на лице от персонала в следните случаи:

1. При смърт на лицето;

2. При невъзможност да изпълнява възложената му работа, поради болест, довела до трайна неработоспособност на лицето;

3. При необходимост от замяна на лицето поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Когато лицето бъде осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5. При лишаване на лицето от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор.

**(4)** В случаите по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на лицето и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по ал. 3. С уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага лице, което да замени досегашния служител, като новият служител трябва да притежава еквивалентна квалификация като тази на заменяния служител и професионален опит, не по-малък от неговия.

**(5)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложението на служител. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложението на служител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг служител с ново уведомление по реда на ал. 4.

**(6)** Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(7)** В случай, че даден служител не е сменен незабавно и е минал период от време, преди новият служител да поеме неговите функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен служител до идването на новия служител, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този служител.

**Чл. 53.** Договорът е сключен под условие с клауза за отложено изпълнение и всяка от Страните може да прекрати Договора след изтичане на тримесечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

### **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 54. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

**Чл. 55.** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

**Чл. 56. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала и известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“), Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване.

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

**(4)** Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирана от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.



**Чл. 57.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

**Чл. 58.** Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

**Чл. 59.** Този Договор може да бъде изменен само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

**Чл. 60. (1)** Някоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

**(2)** Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

**(3)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(4)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.


**Чл. 61.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

**Чл. 62. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

**(2)** За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

**1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ № 2

Тел.: 05351/ 2130, Факс: 05351/2226, ел.-поща: 

Лице за контакт: Калоян Киров, директор „Специализирана администрация“

**2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6

Тел.: 02/477 81 34, Факс: 02/477 81 34, ел.-поща: tender@interhold.bg

Лице за контакт: Десислав Герданов, управител на „Интерхолд“ ЕООД

**(3)** За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязала върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;

5. датата на получаване -при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт, При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването и в съответния регистър.

**Чл.63.** Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

**Чл. 64.** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

**Чл. 65.** Този Договор се състои от 18 (*осемнадесет*) страници и е изготвен и подписан в 3 (*три*) еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

**Чл. 66.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 - *Техническа спецификация;*

Приложение № 2- *Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;*

Приложение № 3 -*Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;*

Приложение № 4 - *Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;*

Приложение № 5 - *Гаранция за изпълнение.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СМЯДОВО**

**ИВАНКА НИКОЛОВА**

*Кмет на община Смядово*

**Радко Чернаков**

*Главен счетоводител*

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**„ИНТЕРХОЛД“**

**ДЕСИСЛАВ ГЕРДАНОВ**

*Управител на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД гр. София*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

## ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54, буква „а“ от ДР на ЗОП, който съдържа технически предписания за изпълнение на поръчката и в които се определят изискваните характеристики на материалите, стоките или консумативите, така че да отговарят на предвидената от възложителя употреба; тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба и производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на строителните работи; характеристиките включват и правила за ценообразуване, условия за изпитване, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него.

Документът има за цел да определи изискванията на възложителя при изготвянето на конкретна оферта от участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка и изпълнение на договора. С техническите спецификации се определя обемът и обхватът на строителните и монтажните работи и изискванията към тяхното изпълнение на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“, включени в предмета на обществената поръчка.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в техническите спецификации, които съдържат изискванията на Възложителя. Техническите спецификации, съставляват неразделна част от договора за строителство, сключен с избрания изпълнител. В спецификациите са описани изискванията за материалите и за качеството на изпълнение на работите. Всички материали и работи, които трябва да се вложат и изпълнят в обектите, трябва да отговарят на описаното в техническите спецификации и проекта.

По отношение на посочени в техническите спецификации конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти. В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Посочените технически спецификации, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнението на проектирането следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

### РАЗДЕЛ 2. ОБХВАТ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ.

#### 2.1. Обхват.

Предметът на обществената поръчка е „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“. Съгласно одобрения проект трябва да се изпълни водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения (СВО) към нея, включително възстановяване на улицните настилки с дължини и диаметри на отделните участъци както следва:

- ул. „Априлско въстание“ (от ул. „Илия Блъсков“ до ул. „Априлско въстание“ А) - водопровод PEHD PE100, PN10 ф90 с дължина 440м.

Изпълнението включва изкоп на отвал, укрепване и разкрепване на строителния изкоп, ръчно подравняване, пясъчна подложка, обратен насип Трошен камък (чакъл 40-70) до 48 см под нивелетата на улицата, ушлътняване, полагане на водопровода на средна дълбочина за участъка с  $h_{cp} = 1,65$  м, полагане на сигнала и детекторна лентя, СВО ф32, включително СК и арматури.

- ул. „Райна княгиня“ - водопровод PEHD PE100, PN10 ф90 с дължина 375,00м.

Изпълнението обхваща изкоп на отвал, укрепване и разкрепване на строителния изкоп, ръчно подравняване, пясъчна подложка, обратен насип Трошен камък (чакъл 40-70) до 48 см под нивелетата на улицата, уплътняване, полагане на водопровода на средна дълбочина за участъка с  $h_{cp} = 1,55$  м, полагане на сигнална и детекторна ленти, СВО ф32, включително СК и арматури.

- ул. „Захари Величков“ - водопровод РЕНД РЕ100, PN10 ф90 с дължина 732,00м.

Изпълнението обхваща полагане на тръби по безизкопна технология, хоризонтален сондаж за безизкопно полагане на тръби и ленти чрез машина за управляемо хоризонтално сондиране (HDD).

Изпълнението обхваща изкоп на отвал, укрепване и разкрепване на строителния изкоп, ръчно подравняване, пясъчна подложка, обратен насип Трошен камък (чакъл 40-70) до 48 см под нивелетата на улицата, уплътняване, полагане на водопровода на средна дълбочина за участъка с  $h_{cp} = 1,65$  м, полагане на сигнална и детекторна ленти, СВО ф32 включително СК и арматури.

- ул. „Иван Вазов“ - водопровод РЕНД РЕ100, PN10 ф90 с дължина 181,00м и РЕНД РЕ100, PN10 ф110 с дължина 280м.

Изпълнението обхваща изкоп на отвал, укрепване и разкрепване на строителния изкоп, ръчно подравняване, пясъчна подложка, обратен насип до 48 см под нивелетата на улицата, уплътняване, полагане на водопровода на средна дълбочина за участъка с  $h_{cp} = 1,65$  м, полагане на сигнална и детекторна ленти, СВО ф32, включително СК и арматури.

За гореизброените участъци да се предвидят и подменят към всеки имот СВО РЕНД РЕ100, PN10, ф32 до 2,0м след регулационната линия и с водомерен възел на  $\frac{1}{2}$ " при  $h_{cp} = 1,45$  м, включително ТСК. Изпълнението обхваща изкоп на отвал, укрепване и разкрепване на строителния изкоп, ръчно подравняване, пясъчна подложка, обратен насип до 48 см под нивелетата на улицата, обратен насип до 20 см. под нивото на тротоара, уплътняване, полагане на водопровода на средна дълбочина за участъка с  $h_{cp} = 1,45$  м, полагане на сигнална и детекторна ленти, включително ТСК. Възстановяване на настилната включително подмяна на бордюри и тротоарни плочи.

В одобрения инвестиционен проект, включително в количествените и стойностните сметки към него, е включен подобект ул. „Генерал Займов“, ул. „Априлско въстание“ А и ул. „Априлско въстание“ (от ул. „Априлско въстание“ А до ул. „Черноризец Храбър“), който е извън предмета на обществената поръчка.

## 2.2. Изисквания за съответствие с нормативната уредба.

Строителството предмет на поръчката трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 януари 2001 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 декември 2017 г.);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124 от 23 декември 1997 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5 декември 2017 г.);
- Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. бр. 102 от 22 декември 2017 г.);
- Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн. ДВ. бр.86 от 1 октомври 1999 г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 6 февруари 2018 г.);
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителните продукти в строежите на Република България (Обн. ДВ. бр. 14 от 20 февруари 2015 г., посл. изм. и доп. бр. 95 от 28 ноември 2017 г.);
- Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 56 от 11 юли 2017 г.);
- Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр. 72 от 15 август 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 11 декември 2012 г.);
- Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн. ДВ. бр.34 от 19 април 2005г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.45 от 14 юни 2016г.);
- Наредба № 8 от 13.08.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места (Обн. ДВ. бр.72 от 13 август 1999г.);
- Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (Обн. ДВ. бр.74 от 21 септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 май 2015г.).

• Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн. ДВ. бр.37 от 4 май 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 ноември 2016г.);

• Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.);

• Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 декември 2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 януари 2017г.);

• Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 98 от 08 декември 2017г.).

### *2.3. Изисквания за съответствие със стандарти.*

При изпълнение на строителството, влаганите материали и технологията на изпълнение трябва да съответстват на изискванията в следните стандарти:

• БДС EN 12201-1:2011/NA:2014 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 2: Тръби. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 12201-3:2011+A1:2013/NA:2014 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 12201-4:2012 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили или еквивалент;

• БДС EN 1092-1:2007+A1:2013/AC:2014 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, вентили, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци или еквивалент;

• БДС EN 14384:2005 Надземни пожарни хидранти колонков тип или еквивалент;

• БДС 1858:1972 Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове или еквивалент;

• БДС 1657:1972 Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти) или еквивалент;

• БДС EN 13808:2013/NA:2017 Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на катионни битумни емулсии. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 13108-1:2016 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон или еквивалент;

• БДС EN 13108-1:2006/NA:2017/ Поправка 1:2017 Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 1: Асфалтобетон. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 12697-27:2017 Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 27: Вземане на проби или еквивалент;

• БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване или еквивалент;

• БДС EN 1340:2005/NA:2013 Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2017 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NA) или еквивалент;

• БДС EN 1339:2005/NA:2013 Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA) или еквивалент.

## **РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ**

### *3.1. Изисквания към работите и материалите.*

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влягане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всички строителни материали (продукти), при изпълнение на работата да отговарят на изискванията по БДС и да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. Материалите да се представят предварително на възложителя и лицето, упражняващо независим строителен надзор за одобрение. На строежа трябва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са предвидени в инвестиционния проект със съответните технически характеристики, които отговарят на техническите правила, норми и нормативи, определени с действащата нормативна уредба и стандарти. Строителните продукти, предназначени за трайно влягане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влягането им в работите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите БДС посочени по-горе, на изискванията на инвестиционните проекти и да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България (ако е приложимо) и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали. При изпълнение на всички работи се изисква спазване на съответните технологии и влягане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

### 3.2. Изисквания към материалите.

*РЕ тръби.* Новопроектираните водопроводи ще се изпълняват от тръби и фасонни /присъединителни/ части са от полиетилен висока плътност PE100 за налягане PN10. Ще се използват тръби с диаметър DN 90, DN 110, DN 32. Тръбите от които ще се изгражда водопровода трябва да са придружени с/с:

- санитарно разрешение от Министерство на здравеопазването;
- сертификат за безвредност;
- сертификат за нетоксичност;
- анализни протоколи;
- техническа характеристика по химическа структура и технологични параметри;
- проспекти.

РЕ тръбите и фитингите за тях, използвани за пренос на питейна вода трябва да отговарят на посочените в т. 2.3. от спецификацията стандарти. Също така предписания за приемане на тръби от PE и съответните фитинги от термопластични материали, подходящи за подаване на питейна вода под налягане се съдържа в следните стандарти: DIN 8072, 8074 - размери, видове свойства; UNI 7611 - тръби от PE HD

за тръбопроводи под налягане - видове размери, свойства; UNI 7615 – тръби от PE HD - основни методи за изпитване; UNI 7612 – фитинги от PE HD за тръбопроводи за флуиди под налягане - видове, размери, свойства; размери, свойства; UNI 7616 + FA 90 – фитинги от PE HD за тръбопроводи за флуиди под налягане – основни методи за изпитвания.

С оглед на еднородност на материала на тръбите и присъединителните елементи на PE и по-добро качество и сигурност при изпълнение на челните заварки, необходимо е производителят на тръбите и присъединителните части да бъде един и същ.

Тръбите трябва да имат следната задължителна трайна маркировка:

- словесна марка (наименование на производител);
- обозначение на материала – PE100;
- група за индекс на толене – 0,003 или 0,005 за PE100;
- номинално налягане – PN10;
- външен диаметър да и дебелина на стената S мм;
- съотношение диаметър/дебелина на стената – SDR17;
- обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията: знаци за качество присъдени

от оторизирани национални организации за качество на пластмасата/;

- обозначение TW – питейна вода;
- номер на производствена машина;
- дата на производство – ден, месец, година;
- данни за дължина на тръбата /само за тръби на рупа/;

Присъединителните /фасонни/ части трябва да имат следната задължителна трайна маркировка:

- словесна марка (наименование на производител);
- обозначение на материала – PE100;
- външен диаметър на тръбата за свързване;
- номинално налягане – PN10;
- съотношение диаметър/дебелина на стената – SDR17;
- обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията: знаци за качество (определени

от оторизирани национални организации за качество на пластмасата);

- година на производство или фабричен код;

Връзките на тръбите и присъединителните части да се изпълняват на челна заварка. За да се осъществи заваръчното свързване е необходима специална заваръчна машина. Краищата на тръбите или тръбното съединение се пристяга със скоби, които са свързани с хидравлично устройство, посредством което заваряемите челни страни се придвижват една към друга. Регулируем нагревателен елемент осигурява необходимата топлинна енергия за заваряването на повърхности. След отстраняване на нагревателния елемент тръбните краища, приведени до температурата на заваряване се свързват челно при определено налягане и след предварително зададено време, без влагане на допълнителен материал, завършва изпълнението на заварката.

Челните заварки се извършват извън изкопа, като тръбите се поставят на подвижни ролкови опори, така че тръбите да не се нараняват външно и да могат лесно да се придвижват при следваща заварка.

Времето за загряване и притискане е различно и зависи от диаметъра, дебелината и др. поради което за да бъде изпълнена качествено челната заварка, трябва да се спазват нормативите, които се предоставят от фирмата производител на машината за челни заварки.

За всяка заварка се съставя протокол, в който се записват всички данни.

След монтажа на тръбите и арматурите в изкопа и след техническото засипване 30 см над тях, да се монтира сигнална лента с два изолирани и един неизолиран проводник, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 13.08.1999 г. Краищата на детекторните ленти да бъдат в охранителни чугунени гърнета на спирателните кранове, пожарни хидранти или шахти. Където няма възможност за извеждане ще се поставят „фалшиви“ чугунени гърнета за ПХ и СК, в които да завършват краищата на лентите. Тези „фалшиви“ гърнета задължително да се отразят на екзекутивните чертежи. Сигналната лента служи за маркиране местоположението на водопровода. Сигналната лента е предвидена за всяко сградно водопроводно отклонение.

На 40 см под кота терен да се постави предпазна лента с надпис "Внимание водопровод".

*Спирателни кранове.* Необходимите спирателни кранове използвани при изпълнение на обекта са DN 32, DN 80 и DN 100.

Спирателните кранове да отговарят на следните стандарти – за къс спирателен кран EN 558-1 GR14 (DIN 3202 F4) и за дълъг спирателен кран EN 558-1 GR15 (DIN 3202 F5). Стоманените фланци да бъдат съгласно БДС EN 1092-1. Фланцовите фасонни части да бъдат съгласно БДС EN 1563.

Спирателния кран използван за уличен водопровод, да е окомплектован с телескопичен шиш и чугунено гърне. За стабилизиране на СК и водопровода е предвидена опорна плоча и опорен блок.

Технически изисквания към спирателните кранове – корпус и капак от ковък чугун, цялоплащно вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязан резба; клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер (годен за питейна вода) с отводнителен отвор; водач на клина от износостойчива пластмаса; свободен проход, без утаечни канали.

Монтажни гарнитури – шишове телескопични, стоманен вал на шина; муфа от сферографичен чугун за връзка на шина с шпиндела на крана, с антикорозионна защита, накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка; външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; вътрешен защитен кожух от PEHD; телескопичният удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на изкопа.

Нерегулирано предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие. Тестване при минимално натоварване на капака – 200 kN, на тялото – 400 kN. Тегло – 6,5 kg.

Чугунените отливки да бъдат придружени със сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие – GSK (накратко Асоциацията за контрол на качеството GSK). Високо сцепление с метал мин. 12 N/mm<sup>2</sup>.

За водопроводните отклонения да се използват тротоарни спирателни кранове с диаметри от Ø 32. За стабилизиране на ТСК и водопровода е предвидена опорна плоча и опорен блок.

Тротоарните спирателни кранове да са с вградени фитинги за полиетиленови тръби от еластомер с пределна здравина 7000 N/cm<sup>2</sup>, пригоден за полагане в агресивни почви. Клин от цветен метал, покрит с гума-еластомер, годен за питейна вода; шпиндел от неръждаема стомана; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови пломби; гладък и свободен проход без утаечни канали; неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на шпиндела посредством няколко O-пръстена и допълнително маншетно уплътнение.

Монтажни гарнитури – шишове телескопични, стоманен вал, външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване и вода; вътрешен защитен кожух от PEHD, резбово присъединяване на монтажна гарнитура (шиша) към крана; окомплектовани с опорни точки, нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие.

*Водовземни скоби от чугун, резбови или фланцови за PE тръби.* Водовземните скоби са универсални или черупкови, обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби за пробиване под налягане да имат преходник за пробиване под налягане. Работното налягане е до 16 bar. Корпус от чугун с епоксидно прахово покритие. Гумено уплътнение от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с полиетиленовата тръба. Концентрични маншетни уплътнения около отворите за свързване. Болтове и шайби от неръждаема стомана. За универсалните скоби – седло от сферографичен чугун и стоманени денти от неръждаема стомана с гума за изолация, епоксидно прахово покритие на седлото на водовземната скоба. Чугунените отливки да бъдат придружени със Сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие (Асоциацията за контрол на качеството, GSK).

*Пожарни хидранти.* Пожарните хидранти да са надземни, съгласно чл. 170, ал. 1 от Наредба №13-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Присъединяването е DN80. Дължината на тръбата е 1.25 м. Тяло - основна тръба от горещо цинкувана стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие. Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Главата на хидранта да е с епоксидно флуидизирано покритие и външно прахово покритие на полиестерна основа. Шиш от неръждаема стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун. Чугунените компоненти да бъдат придружени със Сертификати за инсталации за нанасяне на епоксидно прахово покритие и сертификати за продукт с епоксидно прахово покритие, издадени от Асоциацията за контрол на качеството на силна антикорозионна защита на арматури и фитинги с прахообразно покритие (Асоциацията за контрол на качеството GSK). Двойно сферично затваряне на пожарния хидрант. Интегриран свободен фланец с фланшово уплътнение. Пълно дрениране на остатъчната вода с вграден дренажен отвор. Възможност за инспекция и разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта. Антикорозионна защита на всички части. Възможност за поставяне емблема на града или логото на ВК дружеството.



Изискването за минимален дебит при пожарни хидранти при надземен хидрант с размер DN 80 е 40 л/с. Предварително да се съгласуват хидрантите и хидрантните връзки със съответната местна служба на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

### 3.2. Изисквания към технологията за изпълнение на строителните и монтажните работи.

При започване на строителството да се внимава за наличие по трасето на различни подземни комуникации. Всички изкопни работи и други строителни дейности да се извършват с повишено внимание. Тръбите да се полагат върху пясъчна подложка или подложка от мека пръст от изкопа, внимателно подбрана. Засипването до 30 см над темето на тръбата също да е от пясък, съгласно приложените детайли и указанията на фирмата производител. Останалият обратен насип да се изпълни с Трошен камък (чакъл 40-70), които се трамбоват за да не сляга изкопа. Издигнатите земни маси да се извозват на определено от възложителя депо.

Изпълнението на водопроводите ще става на работни участъци в следната последователност:

- трасирането на работния участък;
- извършване на изкопа на водопровода;
- изпълнение на новия водопровод;
- изпитване и дезинфекция на новия водопровод;
- засипване на траншея;
- възстановяване на пътна настилка, там където има такава;

*Земни работи.* Земните работи да се извършват съгласно правилата за извършване и приемане на строителните работи - раздел „Земни работи и лъсови почви“.

След трасиране на работната полоса, да се започне с изграждане на новопроектирания водопровод. При възникване на проблеми с трасето на водопровода, незабавно да се потърси съдействието на проектанта.

Предвидено е изкопът да бъде с 0,10 м по-дълбок от дъно водопровод. Леглото на тръбите е предвидено да е пясъчна подложка. Предвидено е засипване на тръбите до 30 см над темето на тръба с пясък. Дозасипването на изкопа да стане с трошен камък (чакъл 40-70).

Изкопите са предвидени да се изпълняват неукрепени с откоси. Изкопът с откоси да се изпълни съгласно наредбата за извършване на изкопни работи в земни и скални почви. Ширината на изкопа е приета на база диаметъра на тръбата и условията на естествената почва. Ширината на дъно изкоп е приета съобразно доброто уплътняване, гарантиране безопасността и невредимостта на този, който работи в изкопа, предпазване от срыв на терена.

Изкопът да се предпази от навлизане на повърхностни води. Да се оформи път за отвеждане на повърхностните води извън строителната площадка.

*Подготовка на леглото за поставяне.* След достигане на кота дъно изкоп преди полагане на тръбите, леглото на водопровода да се подравни и засипе с пясък до кота дъно водопровод.

Забранено е да се изравнява положението на тръбите, като се използват камъни, тухли и други единични подпори. Плоскостта на поставянето трябва да е непрекъсната, а там където има опасност от улягане да се вземат мерки за специална обработка на дъното на изкопа.

*Полагане на водопровод.* На така оформеното легло от 10 см се монтират водопроводните тръби.

Тръбите да се заваряват на отделни звена извън изкопа. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите да бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно почистени в крайщата си. Тръбите да бъдат отрязани перпендикулярно на оста. Краищата на вече свързаните участъци, които по някаква причина трябва да останат временно изолирани, да се затворят херметично, за да се предотврати попадане на чужди тела в тях. Арматурата, включена в участъка да бъде подпряна по начин, който гарантира, че няма да упражнява усилия върху тръбите.

*Засипване на изкопа.* След спускане и монтиране на тръбите в изкопа започва засипване на тръбите в следната последователност: първо се засипват тръбите ръчно от страни на пластове от 10 см и до 30 см над темето на тръбата с пясък. Ръчният насип се уплътнява с ръчна трамбовка на пластове след 10 см. На тази фаза на засипване се оставят открити всички връзки, отклонения и всички елементи, които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.

Последващото запълване се предвижда да се направи с изкопаните земни или скални маси на пластове с максимална дебелина 20 см, които да бъдат уплътнени с пневматични трамбовъчни машини.

След засипването с пясък и уплътняването на тръбата се предвижда да се монтира сигнална лента.

Дозапълването на изкопа да се извършва в по-хладните часове на деня. Може да се извършва окончателно засипване само при условие, че температурите са постоянни.

За да се гарантира темперирването на тръбите към терена, един от краищата на участъка трябва винаги да е свободен и съединяването му да се прави след като засипването на изкопа по дължина е достигнало на разстояние 5-6 м. от мястото на свързване.

На 40 см под терена се предвижда поставяне на сигнална лента с метална нишка. По време на строителството, ако се окаже че има високи подпочвени води, да се уведоми проектантът за даване на решение.

**Контрол на монтажа.** При извършването на монтажните работи и засипването да се извършва контрол на качеството на ушлътняването /легло за поставяне на тръбите; засипване, крайно покриване/

**Изпитване на водопроводи.** След полагането на водопроводите те се подлагат на хидравлично изпитване на водоупътността, както и за проверка на якостта и изпълнението на монтажните работи на тръбите, на фасонните части, връзките и другите водопроводни елементи.

Водопроводите се изпитват на три етапа, съгласно чл.162 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г.:

- Предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтаж на арматурата / ПХ, въздушници и др./ когато изкопа се запълва до 30 см над горния ръб на тръбата, като се оставят открити всички връзки, които подлежат на контрол по време на хидравличните проби.

- Изпитване на спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода.

- Основно изпитване (за водоупътност) - след засипване на траншеята и след извършване на всички работи за даден участък от водопровода.

Основното изпитване на водопроводите се извършва на налягане за изпитване по един от следните методи - метод на загуби на вода и метод на загуби на налягане.

Когато в техническата спецификация на проектираните тръби не са дадени указания за определен метод на изпитване, основното изпитване се извършва в съответствие с приложение №7 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г.

Налягането за изпитване се изчислява въз основа на максималното оразмерително налягане, като се отчита по-малката от двете стойности - налягането за изпитване  $/\text{kPa}/ = 1.5 \times \text{макс. оразм. налягане} /\text{kPa}/$  или налягането за изпитване  $/\text{kPa}/ = \text{макс. оразм. налягане} /\text{kPa}/ + 500 \text{ kPa}$

Хидравличната проба се прави на трактове с дължина не по-дълги от 500 м.

Изпитването на водопроводната мрежа се извършва по начина, определен в чл. 162 – чл. 166 от Наредба № 2 от 22 март 2005 г. Изпитването да става на участъци от ок до ок.

Като първа операция трябва да се извърши укрепване на водопровода, като се извърши техническо засипване /30см пясък около и над тръбите/ така, че всички връзки – ЦК, въздушници, ПХ и заварки на водопровода да останат открити. Това се прави за да може да бъдат контролирани всички механични връзки по време на изпитването и при евентуални малки течове или „сълзене“ да се вземат необходимите мерки за отстраняването им /притягане на болтове на СК/. Запълването с вода на водопровода започва с бавно отваряне на спирателния кран, откъдето се подава водата за изпитвания участък, като се внимава да се напълно отворени спирателните вентили, за да се осигури пълно обезвъздушаване на мрежата. След напълването с вода на системата, крановете се затварят. Извършва се оглед на всички връзки – фланшови и заварки на полиетиленовите тръби. След 24 часа се проверява отново за слаби течове и наличие на въздух в системата. Допълва се с вода и обезвъздушва, ако е необходимо и се извършва предварително изпитване.

Налягането се повишава бавно с помпа /ръчна или механична – в зависимост от дължината и диаметъра на участъка (за 1 минута = 1 кг сила/кв.см до достигане на налягане в най-ниската точка от 660kPa (6,6atm), но не повече от 900 kPa. Изпитването е в продължение на 1 час до 2 часа. През това време двата манометъра в най-високата точка. За това време двата манометъра не трябва да променят показанията си. При евентуален спад на налягането, изпитването се прекратява, извършва се оглед на системата. Отстранява се и хидравличното изпитване се повтаря докато резултатът е положителен.

Манометрите с които се извършва изпитването, трябва да се проверени от лицензирана лаборатория за метрологичен контрол.

**Дезинфекция на водопровода.** След изпитване на водопроводите, те трябва да се дезинфекцират. Нови, преустроени или реконструирани водопроводи се въвеждат в експлоатация само след надлежна дезинфекция и промивка.

За правилното и качествено извършване на дезинфекцията, водопроводният участък (мрежа), който подлежи на третиране да бъде временно изолиран, като се създаде възможност за пълнене с дезинфекционен разтвор, изпускане на отработения разтвор и неутрализацията му. Дезинфекцията ще стане на участъци от ок до ок.

Запълването и изпускането на системата с дезинфектант може да се извърши през пожарните хидранти или новоизградените водопроводни отклонения, разположени в най-високата и най-ниската точка на водопроводния участък, който се третира. Третираният водопроводен участък се напълва, затваря се от двете страни и дезинфекционния разтвор се оставя да престои в него 24 часа. След изтичане на контактното време за дезинфекция, отработения разтвор се изпуска в полиетиленов съд, в който се извършва неутрализацията.

*Възстановяване на асфалтова настилка.* Възстановяването на настилка да бъде извършено с два пласта асфалтобетон с дебелина 4 см за пъттен асфалтобетон и 4 см изравнителен непъттен асфалтобетон (биндер). Преди асфалтиране се предвижда изпълнение на трошенокаменна основа 40 см и след това полагане на останалите асфалтови пластове.

Пластовете на новата настилка за категория движение „леко“ са както следва:

- пъттен асфалтобетон тип „А“ - 5 см  $E = 1200 \text{ MPa}$
- долен основен пласт от битумизиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия - 40 см  $E = 250 \text{ MPa}$
- земна основа - 40 см  $E = 30 \text{ MPa}$

Уплътняването да се извършва отдолу нагоре с леки валици задължително с по две задвижващи колела. Битумните разливи да се полагат толкова време преди полагане на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо за да се получи добро сцепване. Изпълнителят трябва да предпазва битумните разливи от повреди, докато следващия пласт се полага.

Полагането на асфалтобетоните смеси да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от  $5^{\circ}\text{C}$  и да не се полага при дъжд и върху мокра заледена или заскрежена основа. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от поелепване на асфалтовата смес по бандажите на валиците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

Валиците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава  $5,0 \text{ km/h}$  за бандажните валици и  $8,0 \text{ km/h}$  за пневматичните валици.

Линията на движение на валиците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. Не се допуска спирането на тежко оборудване и валици върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

На места, недостъпни за работа със стандартни валици, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата пътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

*Изпълнение (възстановяване) на бордюри и тротоарна настилка.* Бордюрите - видими и скрити се поставят върху основа от бетон с размери съгласно техническия проект -  $18 \times 35 \times 50 \text{ cm}$ . Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор на фуга. Основата, върху която се полага бетона, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се поставят върху пресния бетон ръчно. Те се нареждат в правите участъци, а в кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Плочите са с размери  $30 \times 30 \times 4 \text{ cm}$ , като преди това се полага и уплътнява 20 см чакълена настилка. Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5-6 мм, които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор.

### *3.3. Контрол и приемане на работите.*

Контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ се осъществява от консултанта при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор. Административният контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при проектирането и строителството се осъществява от органите по чл. 220 – 223 от ЗУТ.

Едновременно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите се изготвят съответните ексекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на възложителя.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**ИНТЕРХОЛД** ЕООД  
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИ

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

1404 гр. София, бул. „България“ №73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6 /208/  
[tender@interhold.bg](mailto:tender@interhold.bg)

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 202  
(наименование на участника)  
със седалище София и адрес на управление бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6  
представявано от Десислав Герданов в качеството на Управител  
(трите имена на представляващия) (длъжност)  
данни по документ за самоличност лична карта № [ ] издадена на [ ] от [ ]  
(вид и номер на документ, дата, орган и място на издаването)  
тел. 02/477 81 34 факс 02/477 81 34 ел.-поща tender@interhold.bg

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията определени от възложителя посочени в документацията за участие, спецификацията и проекта на договор, Ви представяме оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“.

Заявяваме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним качествено и добросъвестно обществената поръчка, в пълен обем строителни и монтажни работи, посочени в инвестиционния проект, техническата спецификация и документацията за участие. При изпълнението на поръчката ще спазваме и ще изпълним строителството съгласно действащите нормативни актове, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Предлагаме следната организация на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, съгласно изискванията:

**Организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на строителството**

Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на съответните им възложени задачи и ще включва инженерно – технически екип:

- Ръководител екип;
- Технически ръководител на обекта;
- Координатор по безопасност и здраве;
- Отговорник по контрола на качеството;

**Ръководител екип**

- ✓ Организира и ръководи дейността на екипа.
- ✓ Участва активно в подготовката на документите.
- ✓ Делегира допълнителни права и задължения на членовете на ръководния персонал на


Изпълнителя.

✓ Разрешават евентуално възникналите спорни въпроси с ръководния екип на Възложителя. Носят отговорност за реализацията на проекта от гледна точка изпълнение на предмета на Договора: управление на всички процеси на строителството, разходи, срокове, управление на качеството на строежа, спазване на технологичната последователност, залегнала в проекта.

✓ Пряко следят и отговарят за създаването на безопасни условия на работа и тяхното спазване.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

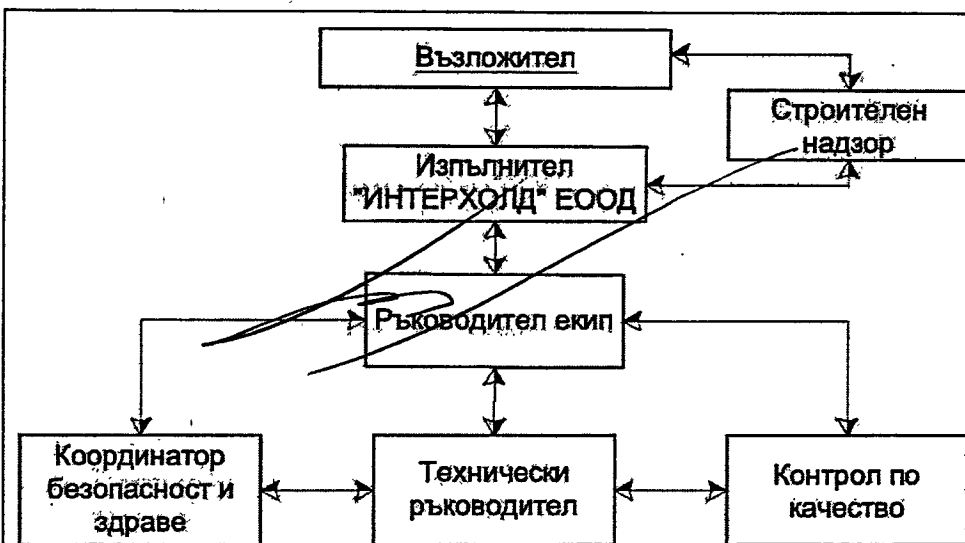

**Технически ръководител:**

✓ Организира и подпомага различните СМР по време на цялостното изпълнение.

✓ Следи за развитието на работите и генералното обезпечение с хора, материали и оборудване.

✓ Участва в процеса на планиране и изготвяне на седмични от

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

за създаване на безопасни условия на работа и тяхното спазване.

✓ Контактна с строителния надзор / консултанта /, експерта по качеството, отговорника по опазване на околната среда

✓ Подава информация за напредъка на строително-монтажните работи на ръководството на дружеството. Създава организация на работните бригади, дава заявки за материали. Строителният инженер носи отговорност за здравето и безопасността на работещите. Той съвместно с ръководителите проекти съставят документите по отчитането на СМР и по изискванията на Наредба №3 от 31.03.2003г.

**Отговорник по контрола на качеството** – организира и е отговорен за изготвяне, съгласуване и спазване на Плана за Контрол на Качеството. Пряко е отговорен за цялостното управление на качеството във всичките му аспекти.

**Координатор по безопасност и здраве** – Организира и отговаря за съставянето на Инструкции по Техника на безопасност и Охрана на труда и контрол на тяхното изпълнение.

Снабдява, изисква и контролира по безопасно полагане на труд и спазване на правилата по техническата безопасност.

Ще присъства и координира изпълнението на взетите решения на съвместните срещи. Докладва за всички възникнали проблеми и взетите мерки на Ръководителя.

Екипът ще изпълни следните задания:

**Договорни:**

- Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор;
- Подготовка на цялата договорна документация;
- Изготвяне Програма за опазване на околната среда;
- Подготовка на Проект за безопасност и здраве;

Подготовка, получаване и представяне на гаранции за изпълнение на договора за обществена поръчка;

**Инженеринг:**

- Набелязване, обсъждане и решаване на различни технически проблеми;
- Проектиране на временното строителство;

**Планиране:**

- Определяне количествата и реда на изпълнение на СМР;
- Изготвяне Финансов план;
- Планиране на мобилизацията;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание

- Организиране на работите;
- Планиране на график за доставки;
- Осъществяване на изпълнение на строителните дейности, напредъка им, разделяне на междинна работна сила и работна сила при съобразяването с критичните дати за приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на работите;
- Планиране на демобилизацията на края на обекта.

**Технически задания:**

- Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация;

**Доставки и логистика:**

- Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване на строителния обект.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда :**

- За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с местно медицинско заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са необходими;
- Определените длъжностни лица по въпросите на здравеопазването, безопасността и защитата на околната среда , ще наблюдават, ръководят, контролират и консултират строителните екипи по въпроси свързани с процедури за предотвратяване на злополуки;


**Работно време и смени:**

- Работното време на обекта ще бъде съгласно Кодекса на труда.

Предлагаме следното разпределение на действията и отговорностите между лицата от персонала на участника:

➤ **Организация на строителната площадка**

**Схема на управление:**

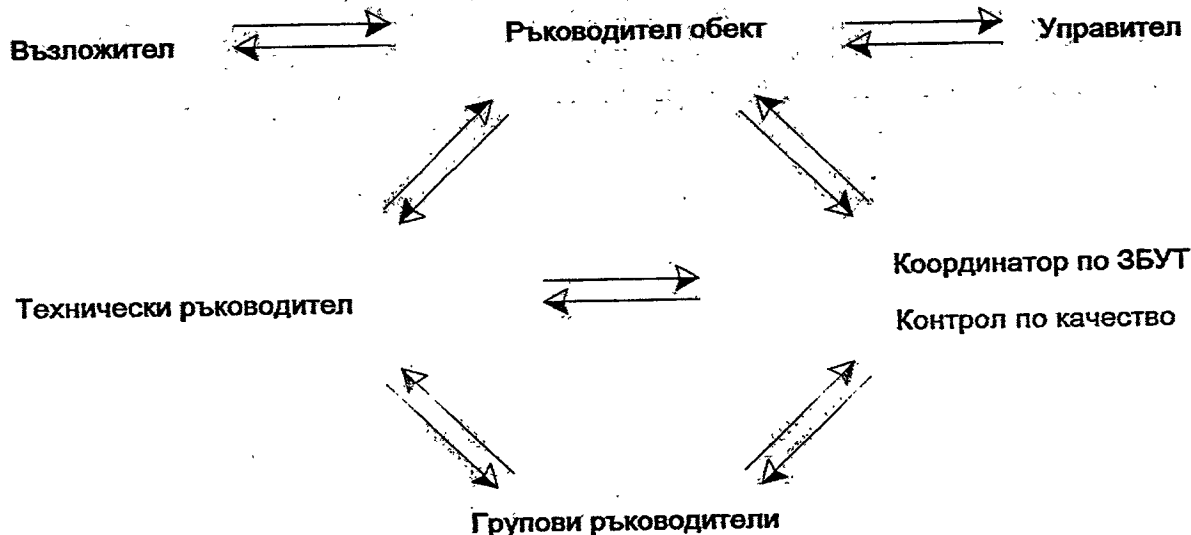

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОБЕКТА**

1. Да информира Възложителя и Управителя за напредъка на обекта;
2. При възникване на проблеми касаещи забавяне изпълнението на обекта, да организира срещи между проектантите, изпълнителя и Управителя на обекта.
3. Да участва в избора на технологията на строителство, механизмите за контрол и с оглед на използване

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

- научно-технически постижения
4. Да участва в и
  5. Да ръководи
  6. Да организира и отговаря за изпълнение на задачите, ритмичността на строителството, качеството и ефективното използване на суровините, материалите, основните и оборотни фондове и човешката сила.
  7. Да следи за спазване съотношението между ръста на производителността на труда и работната заплата.
  8. Да внедрява новите методи за организация.
  9. Да следи за усъвършенстване на производството, технологията и механизацията.
  10. Да разработва и внедрява мероприятия за снижаване трудоемкостта и себестойността на продукцията.
  11. Да организира планирането, изчисляването и съставянето на отчети.
  12. Отчита изпълнението на строителството и го предава на Възложителя.
  13. Да координира работа на отделните изпълнители и подизпълнители.
  14. Да възлага решението на отделни въпроси по изпълнение на договора за съответни изпълнители.
  15. Да следи и отговаря за спазване на проектната себестойност.
  16. Да организира разкриване на възможности за снижаване стойността и времетраенето на проекта.
  17. Да нарежда отстраняване на некачествено извършени работи или вложени некачествени материали.
  18. Да нарежда провеждане на лабораторни изпитания при отклонения от изискванията.
  19. Да спира изпълнението на строителството при неизпълнение на нареждания за отстраняване на констатирани нарушения.
  20. Да води ежедневен дневник за състоянието на обекта.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Нормативни изисквания:** да знае нормативните изисквания по ръководене изпълнението на проекта; нормативните и технически изисквания в областта на строителството; нормативите за разход на материали, суровини и труд; техническите изисквания към качеството.

#### Организационни връзки и взаимоотношения

Длъжността е пряко подчинена на Управителя.

Осигурява комуникацията между Възложител, проектанти, координатор по безопасност и здраве, контрол по качеството, технически ръководител, доставчици на материали.

#### ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

1. Осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.
2. Подробно проучва ПСД и работните чертежи.
3. Участва в разработването на РПОИС.
4. Контролира и координира работата на отделните групи работници.
5. Упражнява контрол на строителната площадка. При констатиране на неспазване на реда и чистотата техническият ръководител може да санкционира груповия ръководител.
6. Техническият ръководител определя границите на работната зона на строителната площадка и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка. Опасна зона е всяка зона в близост или около работното оборудване, в която съществува опасност за здравето или живота на работещите. Грижи се за обозначаването и сигнализацията на зоните.
7. Преглежда и предава работните проекти на изпълнителите.
8. Своевременно съставя актове на всички извършени работи и съставя нови актове на коригирани и впоследствие признати работи от инвеститора.
9. Изработва актовете, които подписва инвеститора.
10. Изготвя мероприятия за снижаване на себестойността.
11. Следи за качествено и срочно изготвяне на отчетните документи.
12. Съвместно с другите отдели изготвя обобщено табло и анализира резултатите.
13. Проверява калкулациите и парафира всички фактури за извършени услуги, получени материали, ползвана механизация и др.
14. Изготвя и подписва нормативни наряди и др.
15. Подготвя заявките за материална подготовка.
16. Създава условия и повишава квалификацията на работниците.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ЗЗЛД

1/10/00 4

17. Изучава **Заличено на основание** тактиката.  
18. Осигурява **чл. 42, ал. 5 от ЗОП,** средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната му обхващат контрола по спазване на изискванията, както и организацията **във връзка с чл. 2 от** нията за здравословните и безопасни условия на труд на строителната площадка **ЗЗЛД** тел следва да контролира и използването на личните предпазни средства **и констатиране на неизползване на личните предпазни средства, техническият ръководител може да санкционира груповия ръководител.**

19. Техническият ръководител има право да поиска отстраняване на работещи или други присъстващи на строителната площадка лица при неспазване от тяхна страна на изискванията за здраве и безопасност при работа.

20. Техническият ръководител е длъжен да осигури прекратяването на работа и навременното извеждане на всички лица от строителната площадка, когато е налице сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им или когато са налице условия, изискващи спиране на работата. Такива условия са неблагоприятни атмосферни условия – ниски/много високи температури, силни ветрове и проливни дъждове, силен снеговалеж.

21. Техническият ръководител трябва незабавно да уведоми управителя на фирмата **Заличено на основание** станала злополука или авария на строителната площадка; **чл. 42, ал. 5 от ЗОП,**

22. Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество;

23. Извършва технологичен контрол на качеството на строителството и на **ЗЗЛД** доставяни на обекта.

24. Контролира правилното поддръждане и съхранение на строителните материали.

**Нормативни изисквания:** да знае законите и други нормативните актове в областта на ТСУ и строителството; методите и технологията на извършваните СМР, свойствата и качествата на материалите; производствените мощности и режима на работа на оборудването и машините работещи на обекта; икономиката и организацията на производството, труда и управлението; трудовото законодателство; охраната на труда.

**Отговорности:** за изпълнението на плана по всички показатели; за срочното и качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти; достигане плановата производителност на труда; безопасните и здравословните условия на труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки; лична материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за допуснатите по негова вина щети и солидарна отговорност за не проявен надзор на преките извършители на щетите; най-икономичното разходване на суровини, материали и енергия.

**Организационни връзки и взаимоотношения**  
**Подчинен е** пряко на ръководителя на обекта.  
**Подчинени длъжности** – групови ръководители, строителни бригади.

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ**

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област.
2. Координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област от работниците.
3. Провежда началния инструктаж и периодичния инструктаж за работещите на обекта.
4. Актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на строителството.
5. Организира заедно с техническия ръководител съвместната работа между всички строители, независимо от етапа на включването им в работата на строителната площадка.
6. Координира контрола по правилното извършване на строителните и монтажните работи.
7. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяването на строителството.

**Нормативни изисквания:** знае законите и други нормативните изисквания в областта на ЗБУТ и Наредба 2

**Организационни връзки и взаимоотношения**  
**Подчинен е** на ръководителя на обекта и управителя.  
**Подчинени длъжности** – групови ръководители, строителни бригади

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КООРДИНАТОР ПО КАЧЕСТВОТО:**

Извършва входящ контрол на **Заличено на основание** али и при констатиране **чл. 42, ал. 5 от ЗОП,** със заявките и техническите сп **чл. 42, ал. 5 от ЗОП,** овременната им зам **във връзка с чл. 2 от** попълването и съхранението на зап **то. Има право да прекра** **ЗЗЛД**

**Заличено на основание**  
**чл. 42, ал. 5 от ЗОП,**  
**във връзка с чл. 2 от**  
**ЗЗЛД**

**Заличено на основание**  
**чл. 42, ал. 5 от ЗОП,**  
**във връзка с чл. 2 от**  
**ЗЗЛД**

**Заличено на основание**  
**чл. 42, ал. 5 от ЗОП,**  
**във връзка с чл. 2 от**  
**ЗЗЛД**

на СМР при ус  
качеството. Пр  
Норматив  
върху качество  
продукти със ст

**Заличено на основание**  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ификациите на проекта. Изготвя отчети относно контрола на  
и с цел избягване на пропуски  
ите и други нормативните изисквания в областта на контрола  
ството и за съответствие на вляганите в строежите строителни  
опасност.

#### Организационни връзки и взаимоотношения

Длъжността е пряко подчинена на ръководителя на обекта и управителя.

#### ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ГРУПОВИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:

1. Задължения в областта на осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд: Правомощията му обхващат контрола по спазване на изискванията, както и организацията на изпълнението на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд на строителната площадка на групата, за която отговаря.
2. Груповия ръководител има право да поиска от техническия ръководител отстраняване на работещи или други присъстващи на строителната площадка лица при неспазване от тяхна страна на изискванията за здраве и безопасност при работа.
3. Груповия ръководител провежда ежедневния инструктаж за работещите на работни места с повишен производствен риск /ако възникне такъв /.
4. Груповите ръководители разпределят работещите по работни места, съобразявайки квалификация, правоспособност, знания и опит.
5. Груповите ръководители следят за правилното изпълнение на детайлите и качеството на извършваните дейности.
6. Груповите ръководители осигуряват реда и чистотата на работните места и строителната площадка. Това задължение е част от общото му задължение за организацията на работата на строежа.
7. Груповите ръководители следва да контролират използването на личните предпазни средства от работещите на строежа.

#### Организационни връзки и взаимоотношения

Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител.

Друга информация, относно организацията на ръководния състав и на персонала, на когото е възложено изпълнението на поръчката, подлежаща на оценка (по преценка на участника):

#### ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

С прилаганата система за управление в „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД се постига нарастване на удовлетвореността на клиентите чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания.

Качеството на доставките и дейностите се постигат чрез използването на съвременни технологии за изпълнение на строително-монтажни работи, ефективно управление на човешките ресурси и подобряване на Системата за управление.

Дружеството се развива устойчиво в един динамично променящ се пазар. Това е от огромно значение за качеството на всички дейности по изпълнение на поръчката.

Ръководството на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД привлича целия персонал към активно участие в управление на качеството чрез обучение и мотивация. Дава се приоритет на квалификацията на персонала и се прилагат съвременни методи за управление на качеството, като гаранция за удовлетворяване на клиентите.

В строителното дружество е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ) по стандартите : ISO 9001:2008- Системи за управление на качеството ; ISO 14001: 2005 - Системи за управление на околната среда и OHSAS 18001: 2008.

В строежа ще бъдат вложени материали и оборудване, определени в проекта, отговарящи на изискванията на българските и/или европейски стандарти. Предвижда се съгласуване с Възложителя на вляганите в строежа материали, елементи, изделия, конструкции и др. Проектните изменения също ще се съгласуват с Възложителя.

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД оценява и подбира доставчиците си според тяхната способност да доставят продукт в съответствие с изискванията.

За точното дефиниране на изискванията към продуктите се поддържат в актуален вид списък на нормативни документи с външен произход – закони, наредби, правилници, норми за проектиране, стандарти и др. Прави се преглед на изискванията заложи в проектната документация за изпълнение. Предвидено е винаги да се дадена спецификация, да се п

**Заличено на основание**  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**Заличено на основание**  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Създаде Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
Всички Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
съответните Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
съответствият Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

бор, оценяване и повторно оценяване на доставчиците. Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
ване, които ще бъдат вложени в строежа, ще бъдат придружени със Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
од и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
вложените продукти със съществените изисквания към строежите, Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

Според случая „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД се разпорежда с несъответстващия продукт по един или повече от следните начини: предприема действия за отстраняване на откритото несъответствие; разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение от подходящо упълномощено лице или когато е приложимо, от клиента; предприемане на действия за предотвратяване на неговото първоначално предвидено използване или прилагане; предприемане на действия, съответстващи на последствията, реални или потенциални от несъответствието в случаите, когато несъответстващия продукт е открит след доставката, или когато използването му е започнало.

Предвидено е предпазването на продуктите по време на вътрешните операции и по време на доставка на продукта до предвиденото местоназначение. Предпазването се прилага и за съставните части на продукта.

Преди получаване на материали и/или оборудване директно на строежа се предвижда, че може да се изпълни предварителна проверка при доставчика.

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД се грижи за собствеността на клиента, докато тя се намира под контрола на дружеството. Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Методите и организацията на текущия контрол и на дейностите при изпълнението на пазалегнали в международния стандарт БДС EN ISO 9001.

#### Прилаганата система за управление в „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД осигурява :

- откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и съевременното им отстраняване;

- редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите;

- повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на дружеството;

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената (строително-монтажна) и контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и всичките видове продукти и дейности.

Спазвайки изискванията на действащите системи за управление на качеството и прилагайки най-добрите практики в това направление, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД изготвя План за качеството, който покрива следните основни аспекти:

- 1) Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта;
- 2) Вътрешни координационни процедури и инструкции;
- 3) Процедури за проверка и одобрение на документите;
- 4) Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР;
- 5) Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали и заготовки;
- 6) Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда;
- 7) Инспекционни процедури;
- 8) Документи по качеството;

Преди изготвянето на Плана за качество, ще бъдат уточнени процесите, тяхната последователност, както и ще бъдат определени критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси. Ще бъдат осигурени ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга на процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.

При възникването на процес, при който се губи съответствие с изискванията, ще бъде осигурен допълнителен и специфичен контрол, който също ще бъде отбелязан в системата за управление на качеството.

Контролът по качеството може да бъде разделен както следва:

1. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- Съот Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от 33ЛД
- Геома на материалите и други необходими документи, удостоверяващи качеството и продуктите и контрол по време на транспортирането;
- Геома ЗЗЛД

## 2. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ

- Спазване на технологията и технологичната последователност;
- Геодезични проучвания;
- Лабораторни измервания;
- Визуален контрол ;

## 3. КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- Протоколи за стандартизация на материалите;
- Протоколи от лабораторни и полеви тестове;
- Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

## 4. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

Проектантът ще упражнява постоянен авторски надзор по време на строителството в следните аспекти;

- Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените работи с пр Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от 33ЛД
- Даване на допълнителни проектни решения и детайли;
- ще оценява резултатите от тестове и анализи;
- ще извършва и одобрява промени в проекта, ако същите са необходими и обосновани;

*Вътрешни правила:*

*Отговорност на ръководството на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД:*

### Ангажираност на ръководството

Ангажираността и целенасоченото участие на Ръководството на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД е определящо при разработването, функционирането и постоянното усъвършенстване на системата за управление на качеството. Те потвърждават този ангажимент като са определили, документирали и разпространили своята политика по качеството, стратегическите и организационните си цели и стремежа към постоянно подобряване на качеството за задоволяване на изискванията на клиентите.

Ръководството на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД предприема всички необходими мерки за осигуряване разбирането, прилагането и изпълнението на политиката по качеството и на целите на всички организационни нива.

Периодично ръководствата извършва прегледи на системата за управление на качеството за установяване на нейната ефективност и ефикасност и съответствие на политиката и целите с настъпилите промени, както и за осигуряване на необходимите ресурси за функционирането ѝ.

Задълженията на Висшите ръководства на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД са:

- формулират политиката и целите на дружествата;
- установяват степента на постигане на тези цели;
- назначават Упълномощен представител на ръководството;
- извършват системен преглед, поддръжка и подобряване на СУК;
- планират и осигуряват ресурси за функциониране и подобряване на СУК ;
- определят отговорностите, правомощията и начините за мотивация на персонала

### Фокус върху клиента

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД управлява процесите въз основа на писмена процедура, която се прилага при преглед на заявките/офертите и договорите, с цел да гарантира, че изискванията на клиента са ясно и точно определени още на входа на тези процеси. Основен предмет на този документ е управлението на запитвания, оферти , договори за изпълнение.

### Политика по качеството

Изпълнение на политиката , поддръжане и подобряване на СУК

Ръководството на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД жва да проверява и оценява прилагането на политиката по качеството и да въ акви отклонения от нея и отстраняване на откритите несъответствия и повторението им.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от 33ЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от 33ЛД

Ръководств... адекватна на цел... служителите са м...  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
...водители носи отговорност за това, че политиката по качеството е изпространена и разбрана от всички служители, както и за това, че тези цели.

**Цели по качеството**

Постоянните цели на „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД произтичат от политиката по качеството. Те са следните:

- ✓ постоянно проучване на пазара и търсене възможности за увеличаване на обема на поръчките;
- ✓ запазване и разширяване на пазарните позиции;
- ✓ осигуряване на нови технически средства и механизация за изпълнение на СМР;
- ✓ въвеждане на нови материали и технологии в строителното производство;
- ✓ подобряване организацията при изпълнение на СМР;
- ✓ постигане на по-висока производителност на труда и по-голяма печалба;
- ✓ постоянно поддържане и подобряване на СУК

**Отговорности при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване на високо качество**

**Работници**

Отговарят за качествено изпълнение на поставените от техническите ръководители задачи

**Технически ръководители**

Отговарят за обезпечаване на производствените звена с необходимата за започване на производствени дейности условия (документация, оборудване, материали др.) и контролират качеството на изпълнение на СМР.

Спазват одобрените график за изпълнението на СМР на обекта.

Всички дейности, свързани с изпълнението на възложените СМР, се ръководят от техническите ръководители в съответствие с изготвения проект, РПОИС и линейния график.

Когато в процеса на изпълнение се наложат промени, същите задължително се отразяват от техническите ръководители, проектантите и инвеститора в заповедната книга на обекта и работния проект.

За осигуряване на качествено изпълнение на СМР попълват на обекта следните одобрени формуляри по качеството:

- Резултат от входящ контрол на доставените материали
- Заявка за закупуване на материали

**Управление на инфраструктурата**

Процесът на определяне на необходимата инфраструктура включва:

✓ Осигуряване и поддръжка на необходимите помещения, работно пространство, съоръжения, инструменти и спомагателни средства съобразно бизнес целите, резултатите и наличните ресурси, предпазването, безопасността и технологичното подновяване;

✓ Прилагане на подходящи методи за поддръжката на машините и съоръженията;

Отговорност за поддържането и подобряването на инфраструктурата носят главния механик и началник „Материално-техническо снабдяване“

**❖ Осигуряване на материални ресурси**

Строителните материали ще се използват съгласно линейния график, като поръчките ще стават еднозначно - точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходимо чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на продукта.

При доставките задължително се извършва на входящ контрол на закупените материали и продукти, съгласно изискванията на процедура «Закупуване» от Интегрираната Система за Управление /ИСУ/.

Леките строителни материали ще бъдат товарени и разтоварвани от строителните работници на обекта, а за по-тежките товари ще се използва подемна техника.

Ще оградим площадката с временна строителна ограда в границите на регулационната линия.

Ще се изгради временно селище, като поставим фургон за техническите ръководители, фургонали работниците, за материалите – открити и закрити, за оказване на спешна медицинска помощ, битови помещения за работниците, химически тоалетни обозначени с табели, охрана, контейнери за отпадъци и др.

Ще се обособят зони за складове по пла...  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Материалите ще се съхраняват, та...  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Ще бъдат подредени и ще бъде об...  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

... за товаро-разтоварни дейно...  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Материалите ще бъдат съхранявани върху изолирани от земната повърхност платформи, които ще предпазват от навлизане на влага и нарушаване на материалите.

Материалите ще бъдат покрити с найлон или брезент за предпазването им от атмосферните влияния.

Когато няма да се изпълняват строително монтажни работи материалите ще бъдат покрити с найлон или брезент за предпазването им от атмосферните влияния.

Строителните отпадъци ще се извозват до депа, определени с разрешително, като се извършва постоянен мониторинг и контрол върху операциите, имащи въздействие върху околна среда.

За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените автобази.

При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране.

Ще се изработи транспортна схема на населените места за извозване на отпадъците до депата, която ще съгласува с Възложителя и контролиращите органи.

Материали, които могат да бъдат рециклирани, и за които има забрана за изхвърляне на сметището, се събират отделно за рециклиране.

Битовите отпадъци, включително хранителни отпадъци ще се събират ежедневно и ще се складира в затворени стоманени контейнери, за да се изхвърлят на подходящо сметохранилище;

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД ще уведоми предварително Възложителя за източниците на материали, които възнамерява да ползва и ще му предостави представителни проби за изпитване, за да може той да се увери, че същите са подходящи.

Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен от Възложителя няма да бъде използван. Изпълнителят ще установява системен контрол върху материалите, които се влагат на обекта.

„Темп“ на доставките на материалните ресурси

Фирмата ще прилага система за планиране на материалните запаси - разходни норми, рецепта (технологии) за производство и материални запаси, съблюдавайки следните основни аспекта от концепцията за сръчност на доставките на материалните ресурси:

- Поръчки от обекта;
- Доставчици на материали - заявки към тях и следене на изпълнението им;
- Работни карти с операции на работници;
- Контрол на работното време на работния състав.

Системата ще позволява на ръководния състав да организира, анализира и контролира производственият процес и напредъка на обекта съблюдавайки стриктно за качеството и темповете на строителството. В системата ще се води отчетност по складове и доставчици.

За доставките на материали от външни доставчици се пускат заявки към тях. Въведените в системата заявки се следят по срок и дата на изпълнение. При влизане в системата на служител, отговорен за доставките на материали, се извеждат информационни съобщения за отклонения от графика на доставките и дали за деня се очакват доставки на материали.

Материалите, приемани в складовете на фирмата, се контролират с направените заявки за доставки. Резултати от внедряването на Система за планиране на материали доведе до следните резултати при изпълнението на проекта:

- поддържане на по-малки складови наличности;
- по - добро и равномерно изпълнение на графика на работа по производствените поръчки;
- по - голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
- по-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените поръчки и дати на експедиция;

Системата за планиране на материалните запаси ще гарантира:

1. Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството;
2. Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварително направените разчети
3. Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат приложени от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана лаборатория, показваща, че материалите отговарят на Техническата спецификация

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

4. Ликвидация на материален ресурс от презапаяване или липса на даден материален ресурс;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

Транспорт във връзка с чл. 2 от на материалните ресурси

Всички ЗЗЛД

и материали, предназначени за влагане в строителството, ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с приложимите изисквания.

Съответните документи трябва да се предоставят преди влагане на съответните суровини и материали в строителството. Строителят може да поиска допълнително изпитване на важни за качеството на обекта суровини и материали с цел проверка на съответствието им.

Всички доставки трябва да отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри предварително от Възложителя и/или евентуални от Проектанта.

Всички доставки ще се складираат в склада на фирмата по начин, съответстващ на предписания от производителите на съответните материали, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно въздействие върху материалите от атмосферните условия и дейностите в складовата база, както и при спазване на мерки за безопасност, защото да не се допуска въздействие от складираните материали върху населението и персонала, и мерки за предупреждаване на инцидента.

Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

## ❖ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ

### ❖ Комуникация между участниците в процеса

#### Комуникационни връзки вътре в екипа на Изпълнителя

Нашият опит в изпълнение на проекти показва, че добрата вътрешна информираност между членовете на екипа е важен фактор за ефективната му работа. Комуникационните връзки вътре в екипа произтичат от вътрешната организация за изпълнението на поръчката.

Комуникационните връзки между екипа на проекта са:

- 1) Вертикални, напр. ръководител на екипа - ключови експерти
- 2) Хоризонтални, напр. между организационните експерти, между техническите експерти и т.н.

Екипът ще провежда редовни ежеседмични срещи за отчитане и обсъждане на напредъка с акцент върху вземане на решения. Други основни средства за комуникация ще бъдат уеб базирана платформа, паметни бележки, телефонни обаждания; ел.поща, skype.

#### Взаимодействие и координация с Възложителя

Съгласно това ние предлагаме при започването на с приложи следния план за комуникация с Възложителя:

1. Определяне на представители на Възложителя за комуникация
2. Определяне на представители на Изпълнителя за комуникация
3. Определяне на начините на комуникация
4. Дефиниране на срок за обратна връзка

Комуникацията между Възложител и Изпълнител се осъществява на ниво Ръководител екип / Ключов експерт и представители на Възложителя. По този начин, на Възложителя не му се налага да контактува с отделните лица, ангажирани с реализацията на проекта по осъществяване на оперативната работа, което има своите безспорни предимства за параметъра ефективност на комуникационните връзки между Възложителя и Изпълнителя. На общи работни срещи за планиране на предстоящи дейности е желателно да присъстват и други членове на екипа, с цел сформирание на ползотворна работна група и работна среда.

В рамките на изпълнение на дейностите по поръчката, Изпълнителят приема да бъде изцяло на разположение на Възложителя, съгласно предложения линеен график. При възникване на технически проблем, Изпълнителят ще реагира незабавно като предложи алтернативно решение, което изцяло да покрива заложените цели и параметри на заданието. В рамките на изпълнението на проекта, всеки един от експертите ще бъде на разположение от понеделник до петък, в рамките на работния ден на посочени на Възложителя контакти. При извънредни ситуации, през почивни дни или след официално работно време, връзката ще се осъществява през мобилен телефон или e-mail, като нашите представители ще се отзоват на проблема възможно най-бързо и ефективно.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



Предварително Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Задача, предлагаме на Възложителя писмените форми за комуникация - протоколи, отчети, записки, официални писма и други, които те доказват ангажиментите и взаимни отговорности. Те не отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните контакти между Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък. Същите ще представляват много важен инструмент за гладко протичане на дейностите. В оперативен порядък комуникациите ще се извършват по ел.поща, по телефона и чрез работни срещи, но те няма изцяло да отменят писмените форми на общуване.

Ръководителят на екипа на сдружителното дружество ще носи отговорност за цялостната координация и взаимодействие с Възложителя и всички заинтересовани страни.

По времето на изпълнението на договора, предлагаме да бъдат провеждани работни срещи между Ръководителя на проекта от страна на Възложителя и Ръководителя на проекта на Изпълнителя, който ще отговаря пряко за осъществяването на непрекъсната и ефективна комуникация и взаимодействие с Възложителя.

По време на срещите, Ръководителят на проекта от страна на Изпълнителя ще информира Ръководителя на проекта от страна на Възложителя за напредъка по дейностите, идентифицираните проблеми и възможните рискове, както и ще дава предложение за тяхното преодоляване. Провежданите периодично срещи ще дадат възможност и на Изпълнителя да получава обратна информация от Възложителя, която е от значение за осъществяването на поръчката. Взаимоотношенията са повод на осъществена услуга включват и обслужване на евентуални рекламации в гаранционния срок; и обратна връзка за проучване на удовлетвореността на Възложителя.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

#### Начин на координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса

При изпълнението на строителството ще приложим интегриран модел за управление, който ще гарантира постигане на целите и очакваните резултати с високо качество.

Процесът на управление за изпълнението на договора за реализация на СМР започва с издаване на заповед на Управителя на фирмата, с която се определя ръководителя на проекта. Същият в съответствие с графика за реализацията на договора, извършва подготовката за строителството на базата на строителната програма.

Строителството на обекта започва с откриване на строителната площадка и съставянето на протокол, Всеки етап от реализацията на строителните дейности се проверява за съответствие с проектно-техническата документация и действащите строителни норми. Ако се налагат изменения, за същите ще се правят предписания, след което се пристъпва отново към проверка за съответствие и изготвяне на записи/ протоколи, актове за скрити работи, междинни сертификати за оценка на извършените работи/.

При одобрение се преминава към реализацията на следващите етапи до предаване на строежа. За извършения обект, предмет на договора се изготвят съответните документи за приемане.

#### Планиране

Работният план е основен инструмент за управление и по същество е подробен план за действие на обществената поръчка. След подписване на договора ще се проведе среща-между Управителя на фирмата, експертите и Възложителя. Тази среща цели изясняване на същността, последователността, детайлите и очакванията на Възложителя. Веднага след това ще се изготви подробен план за действие за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка. В него ще бъдат дефинирани всички дейности и задачи, като детайлното разделяне на отделни етапи и конкретни дейности ще позволи по-лесна организация и управление. Този процес е необходим за да се изготви по-точен график и оптимално да се разпределят ресурсите за изпълнение на задачите.

#### ❖ Отчет за изпълнение

##### По време на строителството задължение на Изпълнителя е:

- съставяне на протоколи от Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Ще се водят дневни и седмични отчети върху изпълнението на работите по обем, време и стойност:

а) дневен - всеки ден се измерва количеството на извършената работа, анализира се получените резултат и в зависимост от "важността" на работата (критична или не) се вземат мерки за отстраняване на отклоненията;

б) седмичен - в края на всяка седмица

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

и преглед на изпълнението

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

работа, като  
• Отче  
закъсняла.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

отклоненията от плана, но и ефективността на приетите мерки.  
от линейния календарен график - завършена, започната, незапочната -

Всеки се приема от Възложителя.

## ➤ Организация на работа при възникване на непредвидени ситуации

Непредвидени ситуации:

### а. Отказ на строителна машина

За бързото отстраняване на повреди на строителна механикация и машини, които биха възпрепятствали нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните мерки:

❖ Временната база ще разполага със сервизен екип, който ще отстранява на място проблемите, които позволяват това;

❖ Ще се позиционира влекач с тежкотоварно ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиз;

❖ Строителното дружество разполага със собствена база с налична строителна механизация и машини, от която можем да направим трансфер на необходимата машина;

❖ В случай, че в базата на строителното дружество в момента няма свободна машина, имаме подписани договори за наем на механизация с наши партньори;

### б. Оттегляне на член от екипа, поради сериозни здравословни или други причини

При съвременно уведомяване на възложителя и консултатнта, в най-кратки срокове ще предложим специалист с еквивалентни знания и опит, който да замени оттеглилия се член на екипа.

Строително дружество разполага с няколко екипа от експерти, които са на постоянен трудов договор и имаме пълна готовност при необходимост да направим замяна на някои от експертите.

### с. Загуба на информация (повредени файлове) във връзка със зачестили кибер атаки или блокирал компютър

По време на работния процес всички служители работят на отделни компютри, като систематично информацията се събира и качва на сървър и на твърд диск, както и на Icloud системи. Това би ограничило до минимална степен загубата на информация при евентуални проблеми, в следствие на кибер атаки или блокирал компютър.

### д. Установяване на допълнителни СМР, които не могат да бъдат предвидени преди откриване на строителната площадка

По време на строителството/ основния ремонт / реконструкцията е възможно да се установят непредвидени в сметката СМР. В такъв случай те се изпълняват като определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР.

При изготвяне на офертата си и при положително участие на строителното дружество в търга и подписване на договор, ще имаме 5% непредвидени разходи за такива непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР.

## ✎ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

В рамките на задължението на изпълнителя за съставяне на документи задължителни съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството ще бъдат съставени актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството, както следва:

### Акт 2 - протокол за откриване на строителна площадка (приложения № 2):

а) раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едноразмерна дървесна растителност); в раздела се записват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на работното място; в раздела се записват

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
заемането на чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
по чл. 157, ал. 1 ввръзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

чл. 42, ал. 5 от ЗОП, ввръзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
и платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение  
б) раздел "Земна строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните реперни точки, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
ввръзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД  
в) (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) раздел III "Констатации от извършен контрол при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на нива на изкоп, цокъл, корниз и било) при засипване на новоизградени или преустроени подземни проводни системи и съоръжения и за заемането в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя и проектантите по съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна", заверките на останалите контролирани нива се извършват в присъствието на проектантите по част "Конструктивна", част "Архитектура" и съответната проектна част в случаите на строеж, представляващ техническа инфраструктура; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

**Акт 4** - заповедна книга на строежа (приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал); в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, регионалните структури на ДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; заповедната книга на строежа съдържа:

- а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;
- б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
- в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;

**Акт 10** - акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части на изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител, в присъствието на лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за строежа; актът заверява и регистрира при спиране на строителството и искания за изменения в проектите; неизпълнените работи се извършват в съответствие с одобрените документи и условията на строежа; актът заверява и регистрира при спиране на строежа данните за състоянието на някои от сградите и геоложки условия; с актът се заверяват и регистрират данните за състоянието на строежа по отношение на сградите, които са в процес на строене.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
ввръзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД  
Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
ввръзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

следните уча Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
спирание на строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа точни данни за съставяне на извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;

**Акт 11** - акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на този акт могат да СМР;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**Акт 12** - акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя, проектантите по съответната част и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

**Акт 13** - акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (приложение № 13) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им;

**Акт 15** - констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, ексекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

**Акт 16** - протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите задължителна;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

**Акт 1** Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
составя се от чл. 42, ал. 5 от ЗОП, със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съставяне на негативна уредба, и съдържа:  
а) резултати от 72-часова проба при експлоатационни условия на монтираните машини, съоръжения, инструменти и др. за доказване на техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.;

б) данните за приетия режим на работно време, технологичните особености на процесите, машините, съоръженията, апаратурата, инсталациите и др., в съответствие с изготвените за целта програми и сключените договори;  
в) доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.

**Акт 19** - Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени Строително Монтажни Работи (СМР) който се документират извършени строително монтажни работи на съответен етап на строителството  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

### ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕУДОБСТВАТА И НЕГАТИВНОТО СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

Изпълнителят «ИНТЕРХОЛД» ЕООД ще предприеме всички необходими мерки, за да се гарантира изпълнението на обекта, включително изпълнението на мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа, мерки за предпазване и защита на работниците и преминаващите край обекта пешеходци и превозни средства, мерки за намаляване на влиянието на строителството на обекта върху работниците и населението.

#### 1. Физически достъп

При започване на строително-монтажните работи, в точност изкопни работи, има опасност от нарушаване на достъпа на жителите на населеното място до дом, търговски обекти и др., като за това ще се предприемат мерки за намаляването на затрудненията на достъп:

- Преди започване на строително-монтажни работи по различните трасета, населението ще бъде информирано за предстоящите ремонтни работи;
- При наличие на изкоп пред входовете на домовете на населението ще бъдат изградени подходи към тях.
- Ще бъдат направени подходи до търговски обекти като бъдат изградени пасарелки с перила и др.
- Ще бъдат взети мерки за осветяване на строителната площадка и на местата за преминаване на пешеходци.
- Откритите изкопи ще бъдат оградени с пана, за да не се допусне достъп на жителите до тях.

#### Контрол върху изпълнението на предложените мерки за физически достъп:

- Ежедневно ще се проверяват изправността на прегражденията.
- Няма да се допуска преминаване на хора в района на извършване на СМР, които не са ангажирани с изпълнението на СМР.
- При въвеждане на ВОД ще се следи за наличието и изправността на необходимите знаци.
- Живущи и гости ще бъдат допускани до съответната им жилищна площ при спазване на мерките за сигурност.

Отговорник – Ръководител екип

Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието (физически достъп) по време на изпълнението на договора

Отговорник – ръководителя на екип.

Период на извършване на мониторинга – през целия период на строителството.

- извършване на периодичен преглед, свързан с анализ на въпросите и въздействието върху населението при изпълнение на обекта, определяне, контрол и управление на аспектите на въздействие;
- провеждане на комплекс от дейности за намаляване на затрудненията;
- планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и работа на обекта с особено внимание към намаляване на влиянието на строителството върху населението;
- извършване на периодичен анализ и оценка на строителните работи и системен контрол за изпълнение на мерките за намаляване на влиянието на строителството върху населението.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД  
Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

на затрудненията

Заличено на основание

чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

във връзка с чл. 2 от

ЗЗЛД

Изпълнение на шумови мерки при реконструкция на водопроводи и съоръжения и ново строителство са различните транспортни и строителни машини и агрегати като: багер, челен товарач, машина за рязане на асфалт, трамбовъчна машина, асфалтополагача техника, валик, компресор, товарни автомобили, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В близост до работещите машини могат да се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни норми. Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време - до завършване на работата в съответния участък от водопроводната мрежа.

Строителните дейности, при които се отделя шум в резултат от работа на машини и ръчен труд ще бъдат съобразени с разпоредбите за „Наредба за обществения ред”.

- Нивата на шум няма да надхвърлят граничните стойности на показателя шум за територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях в съответствие с Приложение 2 към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

- Ще бъдат предприети мерки за екраниране на шума от транспортните средства и механизацията на обекта чрез частични заграждения.

- Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на звукова мощност съгласно приложение № 3 към Наредба за съществения изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха ( обн. ДВ, бр. 11 от 10.02.2006 г.)

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Контрол върху изпълнението на предложените мерки - шум

- Няма да се допуска работа в определеното време за почивка.
- Всички работещи на обекта ще преминат през специален инструктаж за спазване на обществения ред и работа със строителните материали и тяхното съхранение.

Отговорник /контрол по изпълнението на предложените мерки/ – Ръководител екип

Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието: Шумово замърсяване по време на строителството по време на изпълнението на договора

Отговорник – Ръководителя на екип.

Период на извършване на мониторинга – през целия период на строителството.

- извършване на периодичен преглед, свързан с анализ на въпросите и въздействието върху населението при изпълнение на обекта, определяне, контрол и управление на аспектите на въздействие;
- извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във връзка с намаляване на затрудненията за населението;

• непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на затрудненията за населението. Редовната поддръжка на машините намалява отделянето на шум и газове от неправилна работа на двигателите и системите на машините.

## 2.2. Запрашеност

Работа със строителна механизация и транспорта предполага на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер на участъците замърсяването е локално, но обекта е в градската територия и може да надвиши пределно допустимите концентрации (ПДК).

- При извършването на СМР ще бъдат изпълнени всички изисквания на Наредба №1 за допустими норми на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници за работа е прахообразуващи и насипни товари и материали. Запрашените и замърсените пътни и пешеходни настилки ще бъдат почиствани и оросявани, за да се предотврати запрашаването на атмосферния въздух. При необходимост ще се предвиди оросяване на временно съхранявани отпадъци на стр. площадка и др. При

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

- Стройно ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективно и чл. 42, ал. 5 от ЗОП, ите смени и курсовете. Ще бъде използвана само изправна и съвременна строителна във връзка с чл. 2 от аря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически ЗЗЛД те ни ще бъдат обучени за предприемане на всички приложими мерки за предотвратяване на замърсяването на въздуха.

- Ежедневно ще бъдат измивани транспортните средства и механизацията.

### Контрол върху изпълнението на предложените мерки - запряшеност

• Ръководителят на обекта или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността.

Отговорник /контрол по изпълнението на предложените мерки/ – Ръководител екип

**Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието: Замърсяване на въздуха по време на строителството по време на изпълнението на договора**

Отговорник – Ръководителя на екип.

Период на извършване на мониторинга – през целия период на строителството.

- провеждане на комплекс от дейности за намаляване на затрудненията;
- контрол върху използването на материали, необходими за изпълнение на СМР;
- инструктаж на всички работници относно недопускането на замърсяването на атмосферата;
- непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията;
- периодично измерване нивото на прах, газове и отделени миризми

### 2.3. Замърсяване

#### Мерки за опазване на околната среда от замърсяване на почвата

Депозирание и разпръскване на произведени опасни твърди и течни отпадъци /използвани масла от тяхното заменяне със смазки на машината, антифризни вещества, парцали напоени с използвано масло, стърготини, замърсена почва, контейнери, които съдържат опасни вещества и други представят потенциален риск за замърсяването на почвата.

#### Мерки за предотвратяване:

- Действията свързани със смяната на масла и нефтопродукти, които са потенциални замърсители ще се извършват от специализиран персонал и установени за целта места;
- Системите за контрол на оттока от химически вещества към местата за тяхното съхранение ще бъдат инспектирани периодично;
- Материалите, които не са предмет на повторна употреба ще бъдат транспортирани директно към насипите.

#### Мерки за опазване на околната среда от санитарно - битови отпадъци

Строежът и експлоатацията изисква издигането на някои временни съоръжения за да се улеснят основните работи и за да се настанят строителите на обекта. Продуктите от естествените жизнени дейности ще се третират по начин, който е природосъобразен.

#### Мерки за предотвратяване:

- Ще бъдат осигурени химически тоалетни – тип „кабина“ с качествено сервизно обслужване, гарантирано със сertiфицирано качество на услугата по ISO 9001:2000. Материалът от който е изработена кабината е UV устойчива пласмаса. Ще се използват само санитарни препарати, които няма да окажат негативно въздействие върху околната среда. Тоалетните ще се обслужват от оператор, който има грижа за извозване и изливане на отпадъчните води, на обособени за тях места;
- Обектът ще се поддържа чист за да се избегне докарването на пакетни отпадъци и други елементи от наводнения от близките отвори на тръбите за оттичане или водните потоци;
- Битовите отпадъци, възникнали при строителството ще бъдат събирани в предназначени за това контейнери. Те няма да се смесват със строителните отпадъци.

Главното предимство, като резултат от контролираното заустване на отпадъци от човешка дейност ще бъде предотвратяването на замърсяването на подземните води от човешка дейност. Следователно това ще има позитивен ефект върху околната среда.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

евентуал Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

Мъ във връзка с чл. 2 от Околната среда от строителни отпадъци  
Ха 33ЛД

Материалите в отпадъците при строителството определят възможността за рециклиране и за съответно приложение. По принцип материалите, които формират строителните отпадъци, могат да бъдат рециклирани в по-голямата си част:

- Материали, чиито произход е от камък, могат отново да бъдат използвани в някои конструкции чрез раздробяване, но в случаите на стоманобетон, първо трябва да бъде отстранена арматурата;
- Металите могат отново да бъдат използвани в други конструкции или могат да бъдат оползотворени в машиностроенето чрез претопяване и изработване на нов елемент;
- Рециклирането на пластмаса е сложен процес що се отнася до трансформирането и в нестроителен материал, независимо от факта, че може да бъде повторно използвана за тръби, резервоари, профили и други;
- Дървените материали ще бъдат разделени на части и под формата на дървени трици или малки парчета ще бъдат отново влагани в производството на дървени агломерати;
- Асфалтови материали и битум ще бъдат съвместно влагани в направата на пътна настилка и оборудване за пътища.

Материалите получени в следствие на разрушителни и строителни работи потенциално могат да бъдат рециклирани като материал за дренаж, като добавъчен материал за бетон или пътна настилка и могат да бъдат повторно използвани. По-големите по размери парчета могат по-лесно да бъдат повторно, но също могат и да бъдат раздробени и евентуално използвани в производството на керамични изделия.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Производството на стандартни метални елементи предполага както интензивно въздействие върху околната среда по време на извличането на основните сурови материали, така и високата консумация на енергия в процеса на производство и строеж. По отношение на тези материали като отпадъци и тяхната евентуална многократна употреба, трябва да посочим, че като стандартен елемент тя се характеризира с висока степен на многократна употреба и ролята на строителни отпадъци не е характерна. Събирането на едно място и съхранението в специални контейнери за метали ще се иницира в подобни събития.

Като материал от каменен произход, той потенциално е предмет на рециклиране като елемент за дренниране, натрупана маса или павиране и може към това да добавим също лесната употреба на стандартните елементи като такива.

Събирането на останките и изчистването на обекта е необходимо по време на строителни работи и те трябва да се съхраняват в отделни контейнери заедно с елементите от каменен произход.

Що се отнася до отпадъците, целта е те да се намалят до минимум. Ние неизбежно ще разсъждаваме над употребата на рециклирани материали, както и на материали втора ръка.

Сигналните мрежи и ленти са произведени от рециклирани материали и изградени от мрежи от рециклирани пластмаси. Тяхното предназначение е сигнализация насочена към поддържането на сигурността на проекта.

#### Мерки за предотвратяване:

- Ще се избегне разрушаване и събаряне поради изпълнение с лошо качество;
- Ще се избегне закупуването на големи количества материали;
- Ще се изиска прилагането на адекватни мерки по време на транспортирането на материалите, така че да се избегне счупване;
- По време на закупуването на материали ще се изиска тяхното доставяне да е в опаковка, която да позволява повторна употреба или рециклиране;
- Ще се поръчат такива материали, чиито размери са най-подходящи за поставяне и се цели избягване получаването на излишни отпадъци;

Съдовете или средствата в определените места ще бъдат подготвени за събиране на отпадъците. Хората, които са въввлечени в производството на отпадъци ще бъдат информирани за начините на събиране и транспортиране на твърдите отпадъци.

Сортиране на събраните отпадъци (т.е. парчета от строителството, метал, твърди отпадъци, пластмаси, неопасни пакети и опаковки, хартия и картон):

- Ще се диференцират местата, които ще бъдат отредени и ще позволят събирането на отпадъци от работната площадка и за тяхното транспортиране. Ще има контейнери за събирането на такива отпадъци материали;

- Периодично ще се събират раз
- Събраните количества ще се сортират в
- Всички хора от работната площ

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

така че работната площад  
исаните видове;  
ности по отношение на доб

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



Заличено на основание

материали ще се извадят от тяхното сортиране, показвайки местата за тяхното събиране  
др тяхното транспортно средство. Изпълнителят ще изучи алтернативите за употреба на такива  
По отношение на отпадъците Изпълнителят ще изучи алтернативите за употреба на такива  
продукти, от които не се получават опасни материали. Освен това ще се проучат следните мерки:

- Ще се изчистят пътищата от опасни продукти като продукти за отстраняване на кофраж,  
консервационни течности, смоли, лепкави субстанции, разтворител, асфалтови продукти, масла използвани  
за машините, замърсена почва, напоени с масло и флуоресцентни материали;

- Задължението на доставчиците да предадат картата за безопасност на продуктите, от които могат да  
се получат опасни отпадъци, трябва да се включи в договора, който се сключва с тях.

- За да се уреди зона за барабаните с опасни отпадъци, която ще е непробиваема и там ще има система  
за задържане на възможните изпичания: бетонен резервоар или оградна канавка за събирането на излетите  
течности;

- Изхвърлянето на опасните отпадъци ще се извърши от упълномощени лица.

Осъществяването на описаните мерки ще доведе значително подобрене в управлението на твърдите  
отпадъци и особено в изхвърлянето на твърди отпадъци. Могат да се набележат следните предимства:

- Намаляване на количеството на отпадни материали;

- Рециклиране на използвани материали;

- Избягване на сеченето на нови дървета;

- Ще се избегне създаването на нови места/насипи свързани с изхвърляне;

- Ще се избегне замърсяването с опасни отпадъци;

- Ще се избегне замърсяването на водата и почвата;

- Ще се избегне неконтролираното изтичане на отпадни материали;

- Ще се избегнат инциденти, които ще повлияят или ще унищожат екосистемата в региона.

#### Контрол върху изпълнението на предложените мерки - замърсяване

• Всички работещи на обекта ще преминават през специален инструктаж за спазване на обществения  
ред в сградите и работа със строителните материали и тяхното съхранение.

• Изхвърлянето и складирането на отпадъци ще става на точно определени за целта места.

• Ще поставим фургони за техническия и изпълнителския персонал до самия обект. Фургоните ще  
бъдат съответно обзаведени и поддържано в чисто и подредено състояние за времето на строителната  
дейност.

• Ръководителят на обекта или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото  
време на дейността.

Отговорник /контрол по изпълнението на предложените мерки/ – Ръководител екип

**Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху  
аспектите на ежедневието: Производство и управление на отпадъци по време на строителството по  
време на изпълнението на договора**

Отговорник – Ръководителя на екип.

Период на извършване на мониторинга – през целия период на строителството.

• извършване на периодичен преглед, свързан с анализ на въпросите и въздействието върху  
населението при изпълнение на обекта, определяне, контрол и управление на аспектите на въздействие;

• провеждане на комплекс от дейности за намаляване на затрудненията;

• контрол върху използването на материали, необходими за изпълнение на СМР.;

• инструктаж на всички работници относно управление на отпадъците;

• ще се следи дали съоръженията на строителната площадка се поддържат в чист и хигиенен вид;

• ще се следи дали правилно се събират и транспортират строителните и битовите отпадъци;

• непрекъснато поддържане в изправност и чист вид на машините и съоръженията;

• проверяване на механизация за течове (от масло и/или др.) и незабавното уведомяване на  
ръководните органи и съответно на премахването и от обекта и заменянето и с друга/и.

### 3. Комунални услуги

Преди започване на всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат  
трасетата на всички известни подземни комуникации. Преди започване на изкопни работи ще бъдат  
извикани представители на експлоатационните дружества (електроснабдяване, водоснабдяване, телефонни  
и интернет оператори). При отбелязване на местоположението на снимка комуникации около тяхното  
местоположение изкопните работи ще се извършват на безопасна дълбочина.

В случай че при изкопните работи бъдат открити подземни комуникации, ще се вземат  
спешни мерки за обезопасяване, укрепване и защита на нормалната работа на комуникациите.

Заличено на основание

чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

във връзка с чл. 2 от

ЗЗЛД

Заличено на основание

чл. 42, ал. 5 от ЗОП,

във връзка с чл. 2 от

ЗЗЛД

Изхождайки от досегашния си опит и с цел да се намали до минимум времето за реакция имаме разработени стратегии Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

3. чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- Всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат трасетата за водопроводи (при наличието на такива), като при изкопни работи ще се изпълняват ръчно.

При прекъсване на съществуващ сигнализиран водопровод преустановяваме работата и извеждаме работниците от изкопа, и се задейства екипът, който:

- 1) Спира водоподаването в участъка
- 2) Изяснява големината и начина на отстраняване на аварията
- 3) Предприема незабавни действия за възстановяване на повредения участък или изграждане на

временни връзки за възстановяване на водоснабдяването на гражданите информираме представители на Възложителя и концесионера на мрежата.

При прекъсване на съществуващ Несигнализиран водопровод действията ни ще са същите, като с концесионера се изяснява собствеността на водопровода, предназначението му, начина и местата за изолиране на водопровода и необходимостта от възстановяване, и документираме техническите данни на тръбопровода.

При прекъсване на съществуващ Несигнализиран канализационен клон (при наличието на такива) преустановява работата, извеждат се всички работници от траншеята, и се задейства екипът, който:

- 1) Затапва канала в най-близката предходна шахта
- 2) Изяснява големината и начина на отстраняване на аварията
- 3) Предприема незабавни действия за възстановяване на повредения участък или изграждане на

временни връзки за възстановяване на функционирането на участъка включително и организиране на припомпване на каналната вода до следващата РЩ информираме представители на Възложителя и Концесионера.

При прекъсване на съществуващ Несигнализиран канализационен клон действията ще са същите като с концесионера ще се изясни собствеността, предназначението му, начина и местата за изолиране на канала и необходимостта от възстановяване, и документираме техническите данни на тръбопровода.

### 3.2. Електроснабдяване

- Преди започване на всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат трасетата по електроснабдяване, като при изкопни работи ще се изпълняват ръчно.

- При прекъсване кабели Високо напрежение незабавно прекратяваме работата на обекта, извеждаме работниците на безопасно разстояние и информираме електроразпределителното дружество и се изчаква пристигането на техните аварийни групи.

- При необходимост ще бъде предоставено временно електрозахранване.

### 3.3. Газоснабдяване

- Преди започване на всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат трасетата по газоснабдяване, като при изкопни работи ще се изпълняват ръчно.

- При прекъсване на Газопровод незабавно прекратяваме работата на обекта, извеждаме работниците на безопасно разстояние и правим отцепване на района, спираме временно движението и пушенето в района. Информираме Експлоатационното дружество и изчакваме пристигането на аварийната група.

### 3.4. Телефон

- Преди започване на всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат трасетата за телефон, като при изкопни работи ще се изпълняват ръчно.

При прекъсване кабели Ниско напрежение за телефон веднага информираме Експлоатационните дружества и не предприемаме други действия по отремонтирането на трасето. За несигнализираните кабелни трасета заснемаме тяхното разположение и технически параметри.

### 3.5. Интернет.

- Преди започване на всякакъв вид строителни дейности и по-конкретно изкопни, ще се нанесат трасетата за интернет, като при изкопни работи ще се изпълняват ръчно.

- При прекъсване кабели Ниско напрежение (за телефон, радио, телевизия, интернет): Веднага информираме Експлоатационните дружества и не предприемаме други действия по отремонтирането на трасето. За несигнализираните кабелни трасета заснемаме тяхното разположение и технически параметри.

Контрол върху изпълнението на предложените мерки за : водопроводи, електроснабдяване, газопроводи, други кабели (телевизионни, интернет, телефонни)

• Всички прекъсвания на проводите и

стават за възможно най-к

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Предмет започване на работа ще бъдат отбелязани всички проводи и ще се следи за запазването на целоско Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

явленията на отрицателно влияние на строителния процес върху електропроводи, газопроводи, други кабели (телевизионни, интернет, телефонни)

- Отговорник – Ръководителя на екип.
- Период на извършване на мониторинга – през целия период на строителството.
- провеждане на комплекс от дейности за намаляване на затрудненията;
  - постоянен контрол от страна на ръководството;
  - планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала;
  - извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението на поставените задачи;
  - непрекъснато поддържане в исправност на машините и съоръженията, за осигуряване на строителните работи;
  - следене на трасираните точки и обозначените знаци и табели относно местоположението на комуналните услуги.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Ще изпълним работите в предмета на обществената поръчка в срок от 120 дни. Срокът за изпълнение на работите започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2) и изтича на датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Гаранционните срокове за строежа са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

До сключването на договор за обществена поръчка, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие);
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
- Линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията;
- Декларация за конфиденциалност (по преценка на участника).

Наименование на участника

„ИНТЕРХОЛД“ БООД

Дата

19 / 04 / 2018 г.

Законен представител/упълномощено лице  
(име и фамилия)


Десис

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Подпис  
(печат)

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД


Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**ИНТЕРХОЛД** ЕООД  
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**ПОРЪЧКАТА**  
**В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ**  
**СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА**  
**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**



102

„Реконструкция на вътрешна водопроводна  
мрежа в гр. Смядово“

1404 гр. София, бул. „България“ №73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6/208/

tender@interhold.bg

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ение на поръчката

102

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Дата	19 / 04 / 2018 г.
Име и фамилия	Десислав Герданов
Подпис и печат	
Длъжност	Управител
Наименование на участника	„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Образец Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП  
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Полуподписаният/ата

Десислав Герданов

ЕГН

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

(трите имена на декларатора)

Идентификационни по документ за самоличност

лична карта №

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

издадена на

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

от МВР София

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

Качеството си на

Управител

(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

БИК/БУЛСТАТ

202357469

(наименование на участника)

в съответствие с изискванията за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“.

### ДЕКЛАРИРАМ:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

ДАТА: 19.04 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Десислав Герданов  
(име и фамилия)

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Образец № 6. Декларация за срок на валидност на офертата

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП  
за срока на валидност на офертата

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Долуподписаният/ата Десислав Герданов ЕГН \_\_\_\_\_  
(трите имена на декларатора)  
Копирни по документ за самоличност лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_ от МВР София  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)  
Качеството си на Управител  
(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)  
„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 202357469  
(наименование на участника)

в съответствие с изискванията за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет  
„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“

**ДЕКЛАРИРАМ**

Офертата на представявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в документацията за участие), съставлява правно валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 6 (шест) месеца считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

ДАТА: 19.04 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

Десислав Герданов

(име и фамилия)

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Образец № 7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Долуподписаният/ата

Десислав Герданов

ЕГН

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

(трите имена на декларатора)

Идентификационни по документ за самоличност

лична карта №

издадена на

от МВР София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

Управител

(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурор)

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ

202357469

(наименование на участника)

в съответствие с изискванията за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“.

## ДЕКЛАРИРАМ

1. При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а) Българското и пряко приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на финансите (МФ), а именно на <http://www.minfin.bg/> в рубриката „Данъчна политика“;

б) Българското и пряко приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите (МОСВ), а именно в <http://www.moew.government.bg/> в рубриката „Законодателство“

в) Българското и пряко приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика (МТСП), а именно на <http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/> в рубриката „Законодателство“.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: 19.04. 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

(подпис, печат)

Десислав Герданов

(име и фамилия)

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД






55	47	ВОДОПРИЕМНИК ОТЪ ДЪЛБА БОДА СИ 5 МАГАЗИС	3 дър	6р	5	3	Sun 17.18	Thu 17.18	Работна рана(2)
48	44	ВЕЗНАРЛЪН КАПАЦИ ПРОИЗВЕДЕНА ГЕБНА СИ*	5 дър	6р	5	1	Sun 17.18	Thu 16.18	Работна рана
49	45	ДЪРЪ ДЪКОРАМОСТЪ С ШЕРИНА М ВЪН КЪРАИ ДЪКОРАМЪ И ПЪМАКЪ С ШЕРИНА НА ПЪМАКА ПРЕДИШНА ОТРАДА	1 дър	м	3	1	Fri 15.6.18	Fri 15.6.18	Работна рана(2)   Моторен трон
50	46	ДЪРЪ ДЪКОРАМОСТЪ С ШЕРИНА М НА ПЪМАКА ПРЕДИШНА ОТРАДА	4 дър	м	800	1	Fri 15.6.18	Mon 11.6.18	Работна рана(2)   Моторен трон
51	47	ДЕЖИВЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ФУОРМЪ	3 дър	100 м	10.5	1	Wed 11.7.18	Fri 13.7.18	Работна рана
52	48	НАПЪРЪВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО ЮБЕНАТО АТЪ ДО ФУОРМА - СИ СЪВЪЗВАНЕ СЕКЦИОНЪ И ПРЕДИШНА ОТРАДА	6 дър	м	1050	1	Sun 17.18	Thu 10.7.18	Работна рана   Дълба ж хидр налягане
53	49	ПРЕДИШНА ОТРАДА СЪС СЪВЪЗВАНЕ СЕКЦИОНЪ И АДЪМИНИСТРАТИВНО ДОКЪРВАНЕ ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ	3 дър	6р	1	1	Sun 17.18	Thu 3.7.18	Работна рана(2)   Готвене отвари
54	50	ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ	9 дър	100 м2	4.45	1	Sun 9.6.18	Wed 18.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Рचना тръбопровода
55	51	РАБОТА ДА СЪС СЪВЪЗВАНЕ СЕКЦИОНЪ И АДЪМИНИСТРАТИВНО ДОКЪРВАНЕ ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ	9 дър	100 м2	4.45	1	Fri 8.6.18	Thu 19.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Рचना тръбопровода
56	52	РАБОТА ДА СЪС СЪВЪЗВАНЕ СЕКЦИОНЪ И АДЪМИНИСТРАТИВНО ДОКЪРВАНЕ ТЪРЪБОПРОВОДИ И НАПЪРЪВАНЕ	9 дър	100 м2	4.45	1	Fri 8.6.18	Thu 19.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Рचना тръбопровода
57	1	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ШЕРИНА ДО 1.2М - ПЪМАКЪ УКРЕПВАНЕ ВЪЗДИШНО ПОЧВИ С ДЪРЪКОСТА СЪС УЧУВАНЕ НА ТЪРЪКОСТА ПЪМАКЪ <<01.04.02.09>>	10 дър	м3	430	1	Thu 3.7.18	Thu 12.7.18	Работна рана(2)   Моторен трон
58	2	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ШЕРИНА ДО 1.2М - ПЪМАКЪ УКРЕПВАНЕ ВЪЗДИШНО ПОЧВИ С ДЪРЪКОСТА СЪС УЧУВАНЕ НА ТЪРЪКОСТА ПЪМАКЪ <<01.04.02.09>>	10 дър	м3	1002	1	Mon 2.7.18	Wed 11.7.18	Вентр
59	3	ПОДОБРОШКИ ОТ ПЪМАКЪ	12 дър	м3	490	1	Sun 7.7.18	Wed 18.7.18	Работна рана(2)   Вентр
60	4	ЗАКРЕПВАНЕ С ЧАСТЪ НА ТЪРЪКОПРОВОДИ	6 дър	м3	942	1	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	Работна рана(2)   Вентр
61	5	ПРЕДИШНА ОТРАДА ДО ЗЪХЪНА ИЛИ ЗА ПЪМАКЪ СЪС СЪВЪЗВАНЕ СЕКЦИОНЪ РАЗБИВАНЕ РЪЧНО ЗЪМАНИ ПОЧВИ <<01.02.07>>	10 дър	м3	430	1	Wed 4.7.18	Fri 13.7.18	Работна рана
62	6	УКРЕПВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	4.3	1	Sun 7.7.18	Mon 16.7.18	Работна рана
63	7	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	6 дър	м3	1432	1	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	Работна рана   Рचना тръбопровода
64	8	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	430	1	Thu 5.7.18	Sun 14.7.18	Работна рана
65	9	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	2870	1	Wed 4.7.18	Fri 13.7.18	Работна рана   Моторен трон
66	10	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	311	1	Fri 6.7.18	Sun 15.7.18	Санован
67	11	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	500	1	Wed 11.7.18	Fri 20.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
68	12	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	м3	45	1	Wed 11.7.18	Fri 20.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
69	13	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	м	35	1	Thu 10.7.18	Thu 10.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
70	14	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	8	1	Thu 10.7.18	Thu 10.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
71	15	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	4	1	Sun 21.7.18	Sun 21.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
72	16	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	4 дър	м	260	1	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	Работна рана
73	17	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	4 дър	6р	128	1	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	Работна рана
74	18	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	м	20	1	Sun 21.7.18	Sun 21.7.18	Работна рана
75	19	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	1	1	Sun 21.7.18	Sun 21.7.18	Работна рана(2)   Вентр   Моторен трон
76	20	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	4 дър	6р	32	1	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	Работна рана
77	21	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	4 дър	6р	32	1	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	Работна рана
78	22	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	9 дър	6р	8	1	Thu 12.7.18	Fri 20.7.18	Работна рана
79	23	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	1	1	Thu 10.7.18	Thu 10.7.18	Работна рана
80	24	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	4 дър	6р	5	1	Fri 13.7.18	Thu 19.7.18	Работна рана(2)
81	25	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	2	1	Wed 11.7.18	Wed 11.7.18	Работна рана
82	26	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	1 дър	6р	2	1	Wed 11.7.18	Wed 11.7.18	Работна рана
83	27	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	10 дър	6р	16	1	Wed 11.7.18	Fri 20.7.18	Работна рана
84	28	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	6 дър	6р	5	1	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	Работна рана(2)
85	29	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	6 дър	6р	40	1	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	Работна рана(2)
86	30	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	6 дър	м	900	1	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	Работна рана
87	31	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	3 дър	м	6	1	Thu 5.7.18	Fri 13.7.18	Работна рана(2)   Моторен трон
88	32	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	5 дър	м	1000	1	Sun 17.18	Thu 5.7.18	Работна рана(2)   Моторен трон
89	33	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	3 дър	100 м	8.09	1	Sun 5.8.18	Thu 7.8.18	Работна рана
90	34	НАПЪРЪВАНЕ СЪС ЧАСТЪ НА ПЪМАКЪ СЪС 22500СМ <<01.01.00>>	6 дър	м	809	1	Thu 24.7.18	Sun 4.8.18	Работна рана(2)   Моторен трон

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД





№	ИЗМЕНЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ЕДИНИЧНАЯ ЦЕНА	СУММА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ЕДИНИЧНАЯ ЦЕНА	СУММА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ЕДИНИЧНАЯ ЦЕНА	СУММА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА	ЕДИНИЧНАЯ ЦЕНА	СУММА	
137	УШЛИТБЕЖК И ЧАСТЬ НА ПИДАСТОВЕ	6 дър	к3	1250	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18
138	УШЛИТБЕЖК И ЧАСТЬ НА ПИДАСТОВЕ	8 дър	к3	375	Fr 23.8.18	Thu 30.8.18	Работна грама	Fr 23.8.18	Thu 30.8.18	Работна грама	Fr 23.8.18	Thu 30.8.18	Работна грама	Fr 23.8.18	Thu 30.8.18	Работна грама	Fr 23.8.18	Thu 30.8.18
139	УШЛИТБЕЖК И ЧАСТЬ НА ПИДАСТОВЕ	10 дър	к2	2450	Fr 24.8.18	Sat 1.9.18	Работна грама	Fr 24.8.18	Sat 1.9.18	Работна грама	Fr 24.8.18	Sat 1.9.18	Работна грама	Fr 24.8.18	Sat 1.9.18	Работна грама	Fr 24.8.18	Sat 1.9.18
140	УШЛИТБЕЖК И ЧАСТЬ НА ПИДАСТОВЕ	8 дър	к2	271	Fr 24.8.18	Fr 31.8.18	Самостоятел	Fr 24.8.18	Fr 31.8.18	Самостоятел	Fr 24.8.18	Fr 31.8.18	Самостоятел	Fr 24.8.18	Fr 31.8.18	Самостоятел	Fr 24.8.18	Fr 31.8.18
141	Доставка в монтаж гръбк ф80/0 РЕ	9 дър	к	474	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18
142	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф80 РЕ	9 дър	к	35	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18
143	Доставка в монтаж гръбк ф160/0 РЕ	1 дър	к	20	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18
144	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф160 РЕ	1 дър	к	3	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18
145	Доставка в монтаж гръбк ф201/0 РЕ	4 дър	к	310	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18
146	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф201 РЕ	4 дър	к	104	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18
147	ТРОПАРЪКЪНОВЕ КОМПЛИ С ОКСИДАРИТИУРА Ф210/0/ИДЕЛТА	4 дър	к	26	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18
148	МОНТАЖ ВОДОЯЗОВИНА СЪСЪБА ВУ РЕ ТЪРЪН	4 дър	к	26	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18	Работна грама	Fr 7.9.18	Mon 10.9.18
149	МОНТАЖ СЪС СВЕЩЕ РАДИИТИУРА Ф80/0/ИДЕЛТА	1 дър	к	1	Thu 4.9.18	Thu 4.9.18	Работна грама	Thu 4.9.18	Thu 4.9.18	Работна грама	Thu 4.9.18	Thu 4.9.18	Работна грама	Thu 4.9.18	Thu 4.9.18	Работна грама	Thu 4.9.18	Thu 4.9.18
150	МОНТАЖ СЪС СВЕЩЕ РАДИИТИУРА Ф80/0/ИДЕЛТА	1 дър	к	1	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18
151	МОНТАЖ СЪС СВЕЩЕ РАДИИТИУРА Ф80/0/ИДЕЛТА	1 дър	к	5	Sat 1.9.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Sat 1.9.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Sat 1.9.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Sat 1.9.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Sat 1.9.18	Fr 7.9.18
152	МОНТАЖ СЪС СВЕЩЕ РАДИИТИУРА Ф80/0/ИДЕЛТА	2 дър	к	2	Thu 30.8.18	Fr 31.8.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 31.8.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 31.8.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 31.8.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 31.8.18
153	Доставка в монтаж гръбк ф150	1 дър	к	1	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	Работна грама	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18
154	ИНАТРАВА ФУЛНИ ВРЪЗКА Ф150/0/ИДЕЛТА	1 дър	к	14	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18	Работна грама	Thu 30.8.18	Fr 7.9.18
155	ИНАТРАВА ОТКОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПЦИ	6 дър	к	5	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18
156	ИНАТРАВА И УРЕЩАВАНЕ ТЪРЪН НА СК	6 дър	к	39	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18
157	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ПЕНТА	6 дър	к	750	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18	Работна грама	Fr 14.9.18	Wed 19.9.18
158	ДЪРЪ ДЪСЪК МОСТОВЕ С ДИФЕРЕНЦИАЛНИ ВЪЛКОВИ ДЪСЪЦИ И ПЛАВАДЕЛ С ШАРКА	3 дър	к	6	Wed 22.8.18	Thu 28.8.18	Работна грама	Wed 22.8.18	Thu 28.8.18	Работна грама	Wed 22.8.18	Thu 28.8.18	Работна грама	Wed 22.8.18	Thu 28.8.18	Работна грама	Wed 22.8.18	Thu 28.8.18
159	НАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
160	ДЕЗИНЕФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100/0/ИДЕЛТА	3 дър	к	684	Thu 21.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Thu 21.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Thu 21.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Thu 21.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Thu 21.8.18	Thu 21.8.18
161	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
162	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
163	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
164	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
165	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
166	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
167	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18
168	ИНАТРАВА ПРЕДИШКА ОТ РАДИА	5 дър	к	950	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18	Работна грама	Fr 17.8.18	Thu 21.8.18

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

№	ИЗВЕЩЕНИЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗА РАБОТА	Материал	Стойност	Начало работен ден	Крайна дата	Дължина	Забележки
1	ИЗКОП С ОРЪ ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-0355>>	М3	186	Mon 11.6.18	Fri 15.6.18	5 days	Работна ръка[2],М
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УГ.У.ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029a>>	М3	434	Sun 10.6.18	Thu 14.6.18	5 days	Багер
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПИЕСЪК	М3	190	Thu 12.6.18	Thu 21.6.18	10 days	Работна ръка
4	ЗАСИМВЛЕНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	М3	430	Wed 4.7.18	Sat 7.7.18	4 days	Работна ръка
5	ПРЕКЪРВАНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-033>>	М3	186	Thu 12.6.18	Sat 16.6.18	5 days	Работна ръка
6	РАЗКЪРВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 М3	1.86	Fri 15.6.18	Thu 19.6.18	5 days	Работна ръка
7	УПЪЛЪГН ПИЕСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25%ДОСМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	М3	620	Wed 4.7.18	Sat 7.7.18	4 days	Работна ръка;Рч
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	М3	186	Wed 13.6.18	Sun 17.6.18	5 days	Работна ръка
9	НЕШЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКЪРВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	М2	1400	Mon 11.6.18	Wed 20.6.18	10 days	Работна ръка;Моторен тролон
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	135	Thu 14.6.18	Mon 18.6.18	5 days	Самосвал
11	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ВОДОУПР. Ф90 И МОНТАЖ НА ТРЪБА	М	732	Thu 14.6.18	Wed 27.6.18	14 days	Работна ръка[2];Кьртица за сондаж
12	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕДП.ЛЕНТА Ф50 И МОНТАЖ	М	732	Sat 16.6.18	Fri 29.6.18	14 days	Работна ръка[2];Кьртица за сондаж
13	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	52	Thu 14.6.18	Wed 27.6.18	14 days	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
14	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	М	94	Thu 14.6.18	Wed 27.6.18	14 days	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
15	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ ТИП 100 РС	М	732	Thu 14.6.18	Wed 27.6.18	14 days	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
16	Доставка и монтаж тръби ф250/1.0-РЕ	М	20	Wed 13.6.18	Wed 13.6.18	1 day	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка;Автодрин
17	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф250РЕ	бр	5	Wed 13.6.18	Wed 13.6.18	1 day	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
18	Доставка и монтаж тръби ф63/1.0 - РЕ	М	5	Thu 28.6.18	Thu 28.6.18	1 day	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСОННИ ЧАСТИ Ф63РЕ	бр.	2.	Thu 28.6.18	Thu 28.6.18	1 day	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
20	ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	1	Thu 28.6.18	Thu 28.6.18	1 day	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
21	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	М	200	Wed 27.6.18	Sat 30.6.18	4 days	Работна ръка[2];Електродрезгвт.;Апарат за чепна заварка
22	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	88	Wed 27.6.18	Sat 30.6.18	4 days	Работна ръка
23	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР ГАРНИТУРА Ф32-ГОЛПАЦЕГАТ	бр.	22	Wed 27.6.18	Sat 30.6.18	4 days	Работна ръка
24	ТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА ВУ РЕ ТРЪБИ Ф90ММ	бр.	22	Wed 27.6.18	Sat 30.6.18	4 days	Работна ръка
25	ТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	9	Thu 14.6.18	Thu 26.6.18	6 days	Работна ръка
26	ТАЖ ПК ВУ СТОМ ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	8	Sun 17.6.18	Thu 26.6.18	5 days	Работна ръка
27	ТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК Ф50-БЕЗИЩАХТОВ	бр.	1	Thu 28.6.18	Thu 28.6.18	1 day	Работна ръка[2]
28	ТАЖ ФИАНЦЛОВА ВРЪЗКА Ф80ММ ЗА АЦ	бр.	1	Thu 14.6.18	Thu 14.6.18	1 day	Работна ръка
29	РАВА ОПОРНИ ВЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	14	Thu 14.6.18	Wed 27.6.18	8 days	Работна ръка
30	РАВА И УКРЕПВАНЕ ТЪРЪНЕ НА ПК	бр.	9	Wed 4.7.18	Sat 7.7.18	4 days	Работна ръка
31	РАВА И УКРЕПВАНЕ ТЪРЪНЕ НА СК	бр.	31	Wed 4.7.18	Sat 7.7.18	4 days	Работна ръка
32	УПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	М	1100	Wed 4.7.18	Sat 7.7.18	4 days	Работна ръка
33	Доставка тръби фланец 80	бр.	6	Mon 25.6.18	Mon 25.6.18	1 day	Работна ръка
34	ДОСТАВКА ТРЪБ ФЛАНЕЦ 250	бр.	2	Thu 14.6.18	Thu 14.6.18	1 day	Работна ръка
35	НАПРАВА ФЛАНЦ ВРЪЗКА Ф80ММ	бр.	6	Sun 17.6.18	Sun 24.6.18	3 days	Работна ръка
36	НАПРАВА ФЛАНЦ ВРЪЗКА Ф250ММ	бр.	2	Wed 13.6.18	Wed 13.6.18	1 day	Работна ръка
37	ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<2М	бр.	5	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка
38	СК ВЪЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	42	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка
39	ФИЛТЪР 3/4"	бр.	14	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка
40	РЕГУЛАТОР 3/4"	бр.	14	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

41	МАНОВЕТИ ВЪ ОДНОВИТЕЛНИ	гр.	5	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка [2]	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
42	ВОДОПРОВОД В СЪРПИНА ОТ ПОЛЪТЪРЪБИ ЗА	гр.	28	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка [2]	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
43	ВОДОМЕРИ ЗА СТУПЕНА ВОДА ЗА 5 МЗ/ДАС	гр.	5	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка [2]	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
44	ВЪЗВРАТНИ КАМИ ПОЛОВИ НА РЪБА ЗА 4	гр.	5	Sun 17.6.18	Thu 21.6.18	5 days	Работна ръка [2]	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
45	ДЪРВ ДЕКОР МОСТЪ С ШИРИНА 1М ВКЛК-ЦИЯ ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ М-Л	м	3	Fri 8.6.18	Fri 15.6.18	1 day	Работна ръка [2]; Моторен тролон	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
46	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОТГРАДА	м	800	Fri 8.6.18	Mon 11.6.18	4 days	Работна ръка [2]; Моторен тролон	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
47	ЛЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	10.5	Wed 11.7.18	Fri 13.7.18	3 days	Работна ръка; Поща за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
48	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100м300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	м	1050	Sun 1.7.18	Thu 10.7.18	6 days	Работна ръка [2]; Поща за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
49	ГЕОЛЕЗИЧЕБКО ЗАСЪЗНАМАНЕ-ЕКЗКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	гр.	1	Sun 1.7.18	Thu 3.7.18	3 days	Работна ръка [2]; Поща за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
50	РАЗРАДЪЛАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	4.45	Sat 9.6.18	Wed 18.7.18	9 days	Работна ръка [2]; Валер	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
51	РАЗРАДЪЛАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСОФ НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	4.45	Fri 8.6.18	Thu 19.7.18	9 days	чуж. Асфалтопонарч; Валер Трамбовк	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
1	ИЗКОТ С ОПР. ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=чип <2М -30% <<01-01-033>>	м3	430	Tue 3.7.18	Thu 12.7.18	10 days	Работна ръка [2]; Мот	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
2	ИЗКОТ С БАТЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ. У-ВРИ НА ТРАНСПОРТ -70% <<01-04-0298>>	м3	1002	Mon 2.7.18	Wed 11.7.18	10 days	Батер	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПИБЪК	м3	490	Sat 7.7.18	Wed 18.7.18	12 days	Работна ръка [2]; Батер	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м3	942	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	6 days	Работна ръка [2]; Батер	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ. ПОЧВИ ДО 2М ХОРЪЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	430	Wed 4.7.18	Fri 13.7.18	10 days	Работна ръка	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
6	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 м3	4.3	Sat 7.7.18	Mon 16.7.18	10 days	Работна ръка	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
7	УПЪЛЪТНЕНИЕ И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25м40см <<01-01-063>>	м3	1432	Fri 27.7.18	Wed 1.8.18	6 days	Работна ръка; Ръчна трамбовка	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	430	Thu 5.7.18	Sat 14.7.18	10 days	Работна ръка	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
9	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОТИ В-мил <2М Н-мил <2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2870	Wed 4.7.18	Fri 13.7.18	10 days	Работна ръка; Моторен тролон	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	311	Fri 6.7.18	Sun 15.7.18	10 days	Самосвал	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
11	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	500	Wed 11.7.18	Fri 20.7.18	10 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	гр.	45	Wed 11.7.18	Fri 20.7.18	10 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
13	Доставка и монтаж тръби ф160/1.0-РЕ	м	35	Tue 10.7.18	Thu 10.7.18	1 day	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф160-РЕ	гр.	8	Tue 10.7.18	Thu 10.7.18	1 day	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
15	ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	гр.	4	Sat 21.7.18	Sat 21.7.18	1 day	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
16	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	м	260	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
17	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	гр.	128	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
18	Доставка и монтаж тръби ф75/1.0 РЕ	м	20	Sat 21.7.18	Sat 21.7.18	1 day	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
19	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	1	Sat 21.7.18	Sat 21.7.18	1 day	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
20	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
21	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
22	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
23	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
24	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
25	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
26	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
27	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
28	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
29	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
30	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
31	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
32	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
33	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД
34	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	гр.	32	Fri 20.7.18	Mon 23.7.18	4 days	Работна ръка [2]; Електропретат; Апарат за	Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

1	ИЗКОП С ОТР. ПИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	М3	380	Тue 26.7.18	Thu 2.8.18	8 days	Работна ръка[2]; Моторен тролон
2	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У.ВИА НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029а>>	М3	882	Wed 25.7.18	Wed 1.8.18	8 days	Батер
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЪСЪК	М3	420	Sun 29.7.18	Thu 7.8.18	10 days	Работна ръка[2]; Батер
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	М3	840	Mon 20.8.18	Sat 25.8.18	6 days	Работна ръка[2]; Батер
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ. ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	М3	380	Fri 27.7.18	Fri 3.8.18	8 days	Работна ръка[2]; Батер
6	РАЗРЯВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	М3	3.8	Mon 30.7.18	Mon 6.8.18	8 days	Работна ръка[2]; Батер
7	УЛЪРЪТЪН ПЪСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	М3	1260	Mon 20.8.18	Sat 25.8.18	6 days	Работна ръка[2]; Батер
8	НАТОВАДВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	М3	380	Sat 28.7.18	Sat 4.8.18	8 days	Работна ръка[2]; Батер
9	НЕПЪЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	М2	2465	Fri 27.7.18	Mon 6.8.18	11 days	Работна ръка[2]; Моторен тролон
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	273	Sun 29.7.18	Sun 5.8.18	8 days	Самосвал
11	Доставка и монтаж гръби ф90/1.0 РЕ	М	193	Sat 11.8.18	Thu 14.8.18	4 days	Работна ръка[2]; Електропретат; ченна заварка
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	12	Sat 11.8.18	Thu 14.8.18	4 days	Работна ръка[2]; Електропретат; ченна заварка
13	Доставка и монтаж гръби ф160/1.0 РЕ	М	30	Fri 3.8.18	Sat 4.8.18	2 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф160-РЕ	бр.	6	Fri 3.8.18	Sat 4.8.18	2 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
15	Доставка и монтаж гръби ф32/1.0 РЕ	М	220	Thu 14.8.18	Thu 16.8.18	3 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
16	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	108	Thu 14.8.18	Thu 16.8.18	3 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
17	Доставка и монтаж гръби ф110/1.0 РЕ	М	280	Sun 5.8.18	Fri 10.8.18	6 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
	ИНИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	1	Thu 14.8.18	Thu 14.8.18	1 day	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
	АР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	27	Thu 14.8.18	Thu 16.8.18	3 days	Работна ръка
	УЖ ВОДОВЪЗЕМНА СКОБА ВУ РЕ ТРЪБИ Ф80ММ	бр.	6	Thu 16.8.18	Thu 16.8.18	1 day	Работна ръка
	УЖ МЕТАЛНА ВОДОВЪЗЕМНА СКОБА ВУ РЕ ТРЪБИ Ф110ММ	бр.	21	Thu 14.8.18	Wed 15.8.18	2 days	Работна ръка
	УЖ СК С ПРЕШП. ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	1	Mon 13.8.18	Mon 13.8.18	1 day	Работна ръка
	УЖ СК С ПРЕШП. ГАРНИТУРА Ф150ММ	бр.	1	Sat 4.8.18	Sat 4.8.18	1 day	Работна ръка
	УЖ СК С ПРЕШП. ГАРНИТУРА Ф100ММ	бр.	4	Sun 5.8.18	Mon 13.8.18	4 days	Работна ръка
	УЖ ПК ВУ СТОМ. ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	2	Sat 11.8.18	Sat 11.8.18	1 day	Работна ръка
	УЖ ФИНАШОВА ВРЪЗКА Ф80ММ ЗА АЦ	бр.	1	Sun 5.8.18	Sun 5.8.18	1 day	Работна ръка
	УЖ ФИНАШОВА ВРЪЗКА Ф100ММ ЗА АЦ	бр.	11	Sun 5.8.18	Thu 14.8.18	10 days	Работна ръка
28	НАПРАВА ОТОРНИ ВЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	5	Mon 20.8.18	Sat 25.8.18	6 days	Работна ръка[2]
29	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА ПК	бр.	31	Mon 20.8.18	Sat 25.8.18	6 days	Работна ръка[2]
30	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА СК	бр.	750	Mon 20.8.18	Sat 25.8.18	6 days	Работна ръка
31	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	М	6	Fri 27.7.18	Thu 2.8.18	3 days	Работна ръка[2]; Моторен тролон
32	ДЪРВ. ЛЕКОС МОСТЪ С ПИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ, ДЮШЕМЕ И ТРАПЕЦ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	М	960	Thu 24.7.18	Sat 28.7.18	5 days	Работна ръка[2]; Моторен тролон
33	НАПРАВА ПРЕПАЗНА ОГРАДА	М	6.93	Wed 29.8.18	Fri 31.8.18	3 days	Работна ръка
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	693	Wed 29.8.18	Thu 28.8.18	6 days	Работна ръка; Ловца за хидр. налягане
35	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	бр.	1	Fri 17.8.18	Sun 19.8.18	3 days	Работна ръка[2]; Топлана станция
36	ГЪОДЕИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЖКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1	Thu 14.8.18	Thu 14.8.18	1 day	Работна ръка
37	МОНТАЖ АВТОМ. ВЪЗДУШНИК Ф50-БЕЗШАХТОВ	бр.	10	Sun 5.8.18	Fri 10.8.18	6 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
38	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф110 РЕ	бр.	10	Sun 5.8.18	Fri 10.8.18	6 days	Работна ръка[2]; Електропретат; Апарат за ченна заварка
1	ИЗКОП С ОТР. ПИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	3	375	Thu 21.8.18	Thu 28.8.18	8 days	Работна ръка[2]; Батер
2	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЪСЪК	3	415	Sat 25.8.18	Sat 1.9.18	8 days	Работна ръка
3	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	3	835	Fri 14.9.18	Wed 19.9.18	6 days	Работна ръка
4	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ. ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	3	375	Wed 22.8.18	Wed 29.8.18	8 days	Работна ръка
5	РАЗРЯВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	М3	3.75	Sat 25.8.18	Sat 1.9.18	8 days	Работна ръка
6	УПЪЛЪТН ПЪСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	3	1250	Fri 14.9.18	Wed 19.9.18	6 days	Работна ръка[2]; Батер

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД


8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМЪНОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	375	Thu 23.8.18	Thu 30.8.18	8 days	Работна ржк2
9	НЕПДЪЛГНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В-или<0М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2450	Thu 23.8.18	Sat 1.9.18	10 days	Работна ржк2;Моторен трйон
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	кубс	271	Fri 24.8.18	Fri 31.8.18	8 days	Самосвал
11	Доставка и монтаж тръби ф90/1,0 РЕ	м	474	Thu 30.8.18	Fri 7.9.18	9 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	35	Thu 30.8.18	Fri 7.9.18	9 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
13	Доставка и монтаж тръби ф160/1,0-РЕ	м	20	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф160-РЕ	бр.	3	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
15	Доставка и монтаж тръби ф32/1,0-РЕ	м	310	Fri 7.9.18	Mon 10.9.18	4 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
16	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	104	Fri 7.9.18	Mon 10.9.18	4 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
17	ТРОГАР КРАНОВЕ КОМПЛ С ОХР.ГАРИНТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	26	Fri 7.9.18	Mon 10.9.18	4 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
18	МОНТАЖ ВОДОВЕЗНА СКОБА ВЪУ РЕ ТРЪБИ Ф90ММ	бр.	26	Fri 7.9.18	Mon 10.9.18	4 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРИНТУРА ф80ММ	бр.	1	Tue 4.9.18	Tue 4.9.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРИНТУРА ф150ММ	бр.	1	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
21	МОНТАЖ ПК ВЪУ СТОМ.ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	5	Sat 1.9.18	Fri 7.9.18	4 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
22	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ ЗА АЦ	бр.	2	Thu 30.8.18	Fri 31.8.18	2 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
23	Доставка и монтаж тлук ф150	бр.	1	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
24	НАПРАВА ФЛАНШ ВРЪЗКА ф150ММ	бр.	1	Wed 29.8.18	Wed 29.8.18	1 day	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
25	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	14	Thu 30.8.18	Fri 7.9.18	9 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
26	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	5	Fri 14.9.18	Wed 19.9.18	6 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
27	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	39	Fri 14.9.18	Wed 19.9.18	6 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
28	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	750	Fri 14.9.18	Wed 19.9.18	6 days	Работна ржк2];Електроапарат;Апарат за ченна заварка
29	ДЪРВ ДЕКОР МОСТЪЧ С ПИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ ДЪОШЕМЕ И ПЕРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	6	Wed 22.8.18	Tue 28.8.18	3 days	Работна ржк2];Моторен трйон
30	НАПРАВА ПРЕЦАЗНА ОТРАДА	м	950	Fri 17.8.18	Tue 21.8.18	5 days	Работна ржк2];Моторен трйон
31	ЛЕЗИОНЕЖИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	м	684	Sun 23.9.18	Tue 25.9.18	3 days	Работна ржк2];Моторен трйон
32	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100м300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	м	684	Tue 11.9.18	Sat 22.9.18	6 days	Работна ржк2];Моторен трйон
33	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЖЕКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1	Tue 11.9.18	Mon 24.9.18	7 days	Работна ржк2];Моторен трйон
34	РАЗВАЛНАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	0.75	Sat 18.8.18	Tue 25.9.18	9 days	Работна ржк2];Моторен трйон
35	РАЗВАЛНАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ. НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	0.75	Fri 17.8.18	Tue 21.8.18	5 days	Работна ржк2];Моторен трйон

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Забележка:  
1. Датите за "Начален ден" и "Краен ден" са условни, и зависят от датата на подписване на Протокол № 2.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



58

7

8



1120/111

Редни №-та  
Работни дни  
Освободителни дни  
Абсолютни дни

4	4	6	15	18	31	27	15	16	7	14	17	16	17	13	14	11	5	16	18	16	13	8	8	11	7	12	5	8	8	8	5	5	4	4
4	4	6	15	18	31	27	15	16	7	14	17	16	17	13	14	11	5	16	18	16	13	8	8	11	7	12	5	8	8	8	5	5	4	4

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД






2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

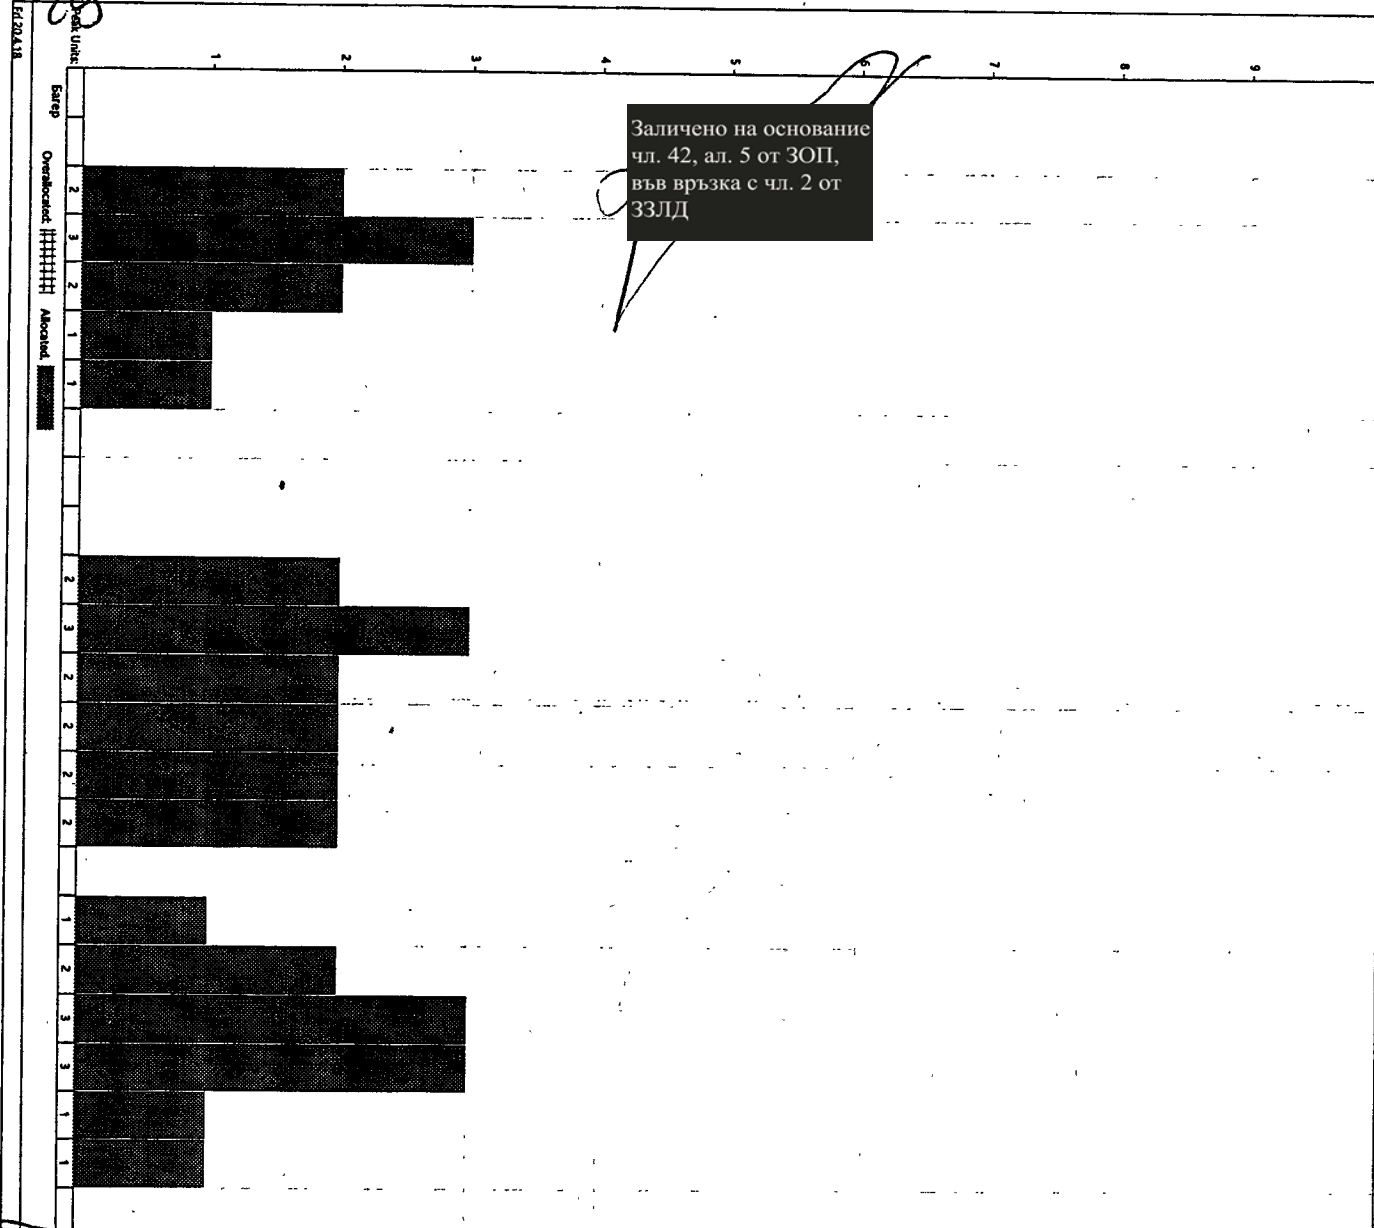

Месец

Енерг  
Освободен

Абсолют

2011


2012

2011

2012

12/2013

Ред. Linie Реди в грамове Оценки: ||||| Абсолют Десетил. Средна

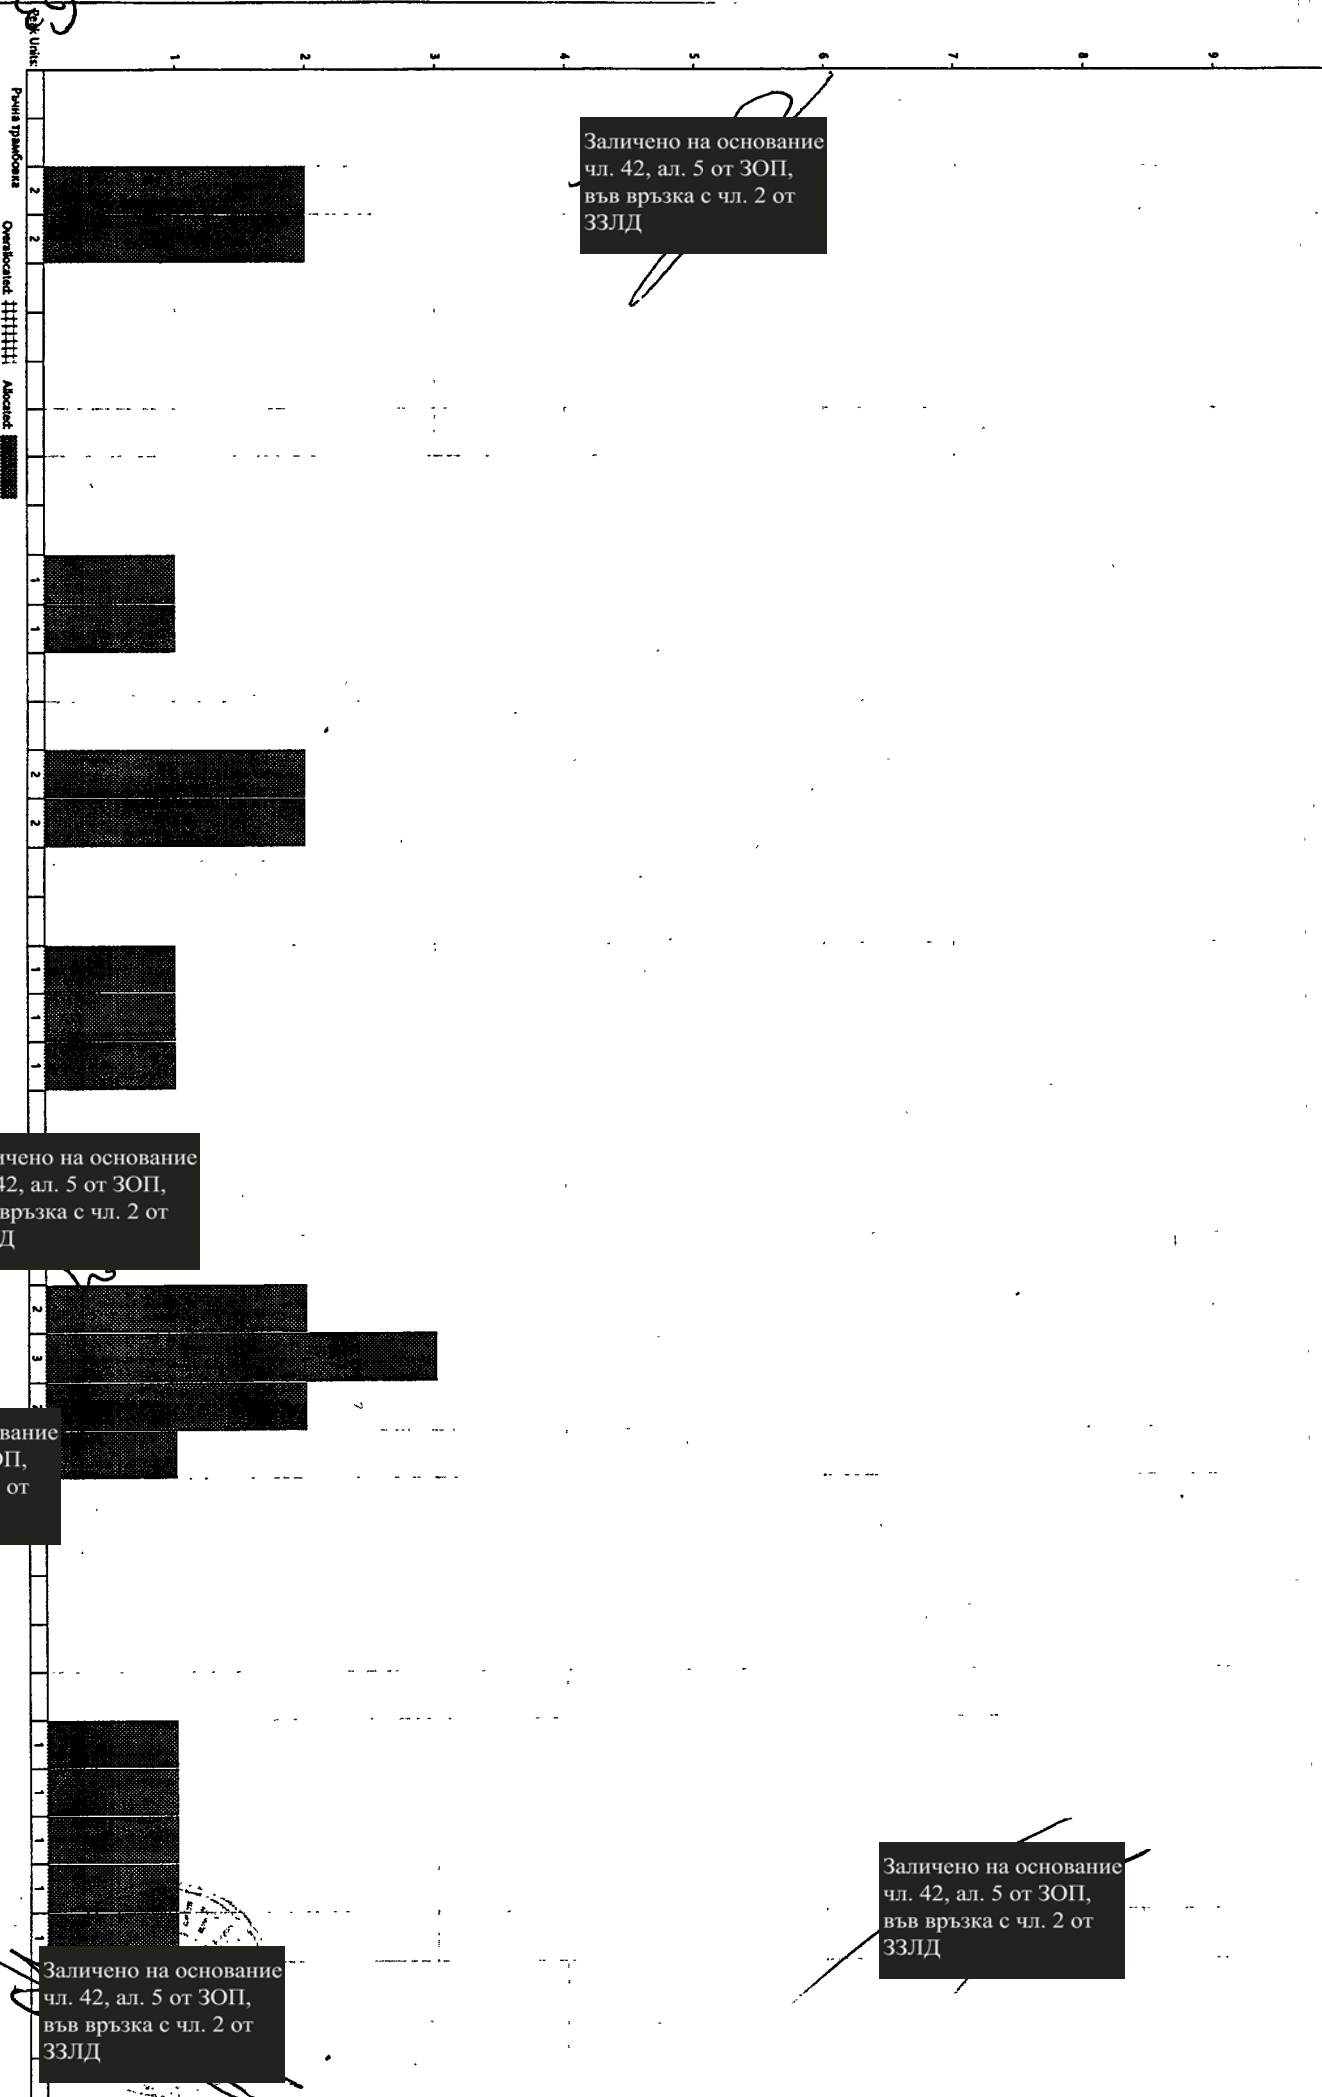

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18 31 19 32 20 33 21 34 22 35 23 36 24 37 25 38 26 39 27 40 28 41 29 42 30 43 31 44 32 45 33 46 34 47 35 48 36 49 37 50 38 51 39 52 40 53 41 54 42 55 43 56 44 57 45 58 46 59 47 60 48 61 49 62 50 63 51 64 52 65 53 66 54 67 55 68 56 69 57 70 58 71 59 72 60 73 61 74 62 75 63 76 64 77 65 78 66 79 67 80 68 81 69 82 70 83 71 84 72 85 73 86 74 87 75 88 76 89 77 90 78 91 79 92 80 93 81 94 82 95 83 96 84 97 85 98 86 99 87 100 88 101 89 102 90 103 91 104 92 105 93 106 94 107 95 108 96 109 97 110 98 111 99 112 100 113 101 114 102 115 103 116 104 117 105 118 106 119 107 120 108 121 109 122 110 123 111 124 112 125 113 126 114 127 115 128 116 129 117 130 118 131 119 132

Б/2018

Ред. №

Смисъл

Overlaid

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Allocated

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

69

8120418

Коригираща за оценка

Оценка за оценка

Абсолют

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

10  
2  
15  
2  
16  
5  
11  
14  
11  
17  
14  
20  
17  
23  
26  
23  
29  
22  
32  
5  
8  
35  
38  
41  
17  
44  
20  
47  
23  
26  
31  
38  
44  
47  
54  
51  
58  
64  
67  
74  
71  
78  
84  
87  
94  
91  
98  
104  
107  
114  
111  
118  
124  
121  
128  
134  
140  
147  
153  
160  
166  
173  
179  
186  
192  
199  
205  
212  
218  
225  
231  
238  
244  
251  
257  
264  
270  
277  
283  
290  
296  
303  
309  
316  
322


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

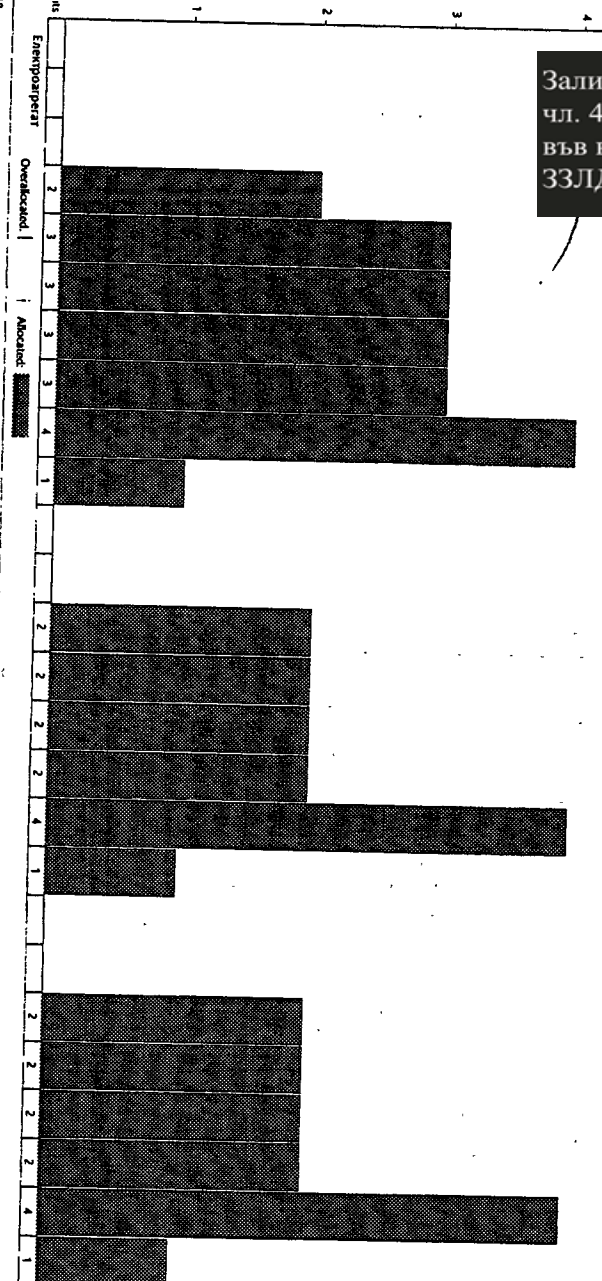

Handwritten text: *Пореден номер*

Handwritten number: 69

69

Лист: 2  
Адресът за членяване: 2  
Осигуряващ: 3  
Адресът: 3

Адресът: 1

Адресът: 2

Адресът: 2

Адресът: 2

Адресът: 4

Адресът: 1

Адресът: 2

Адресът: 2

Адресът: 2

Адресът: 2

Адресът: 3

Адресът: 1

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

*[Handwritten signature]*

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



89

Автори

Оригинален

Автори

Автори

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД


Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

05

Помна за мулти, таваните  
Очелковане: |||||  
Абсолют:

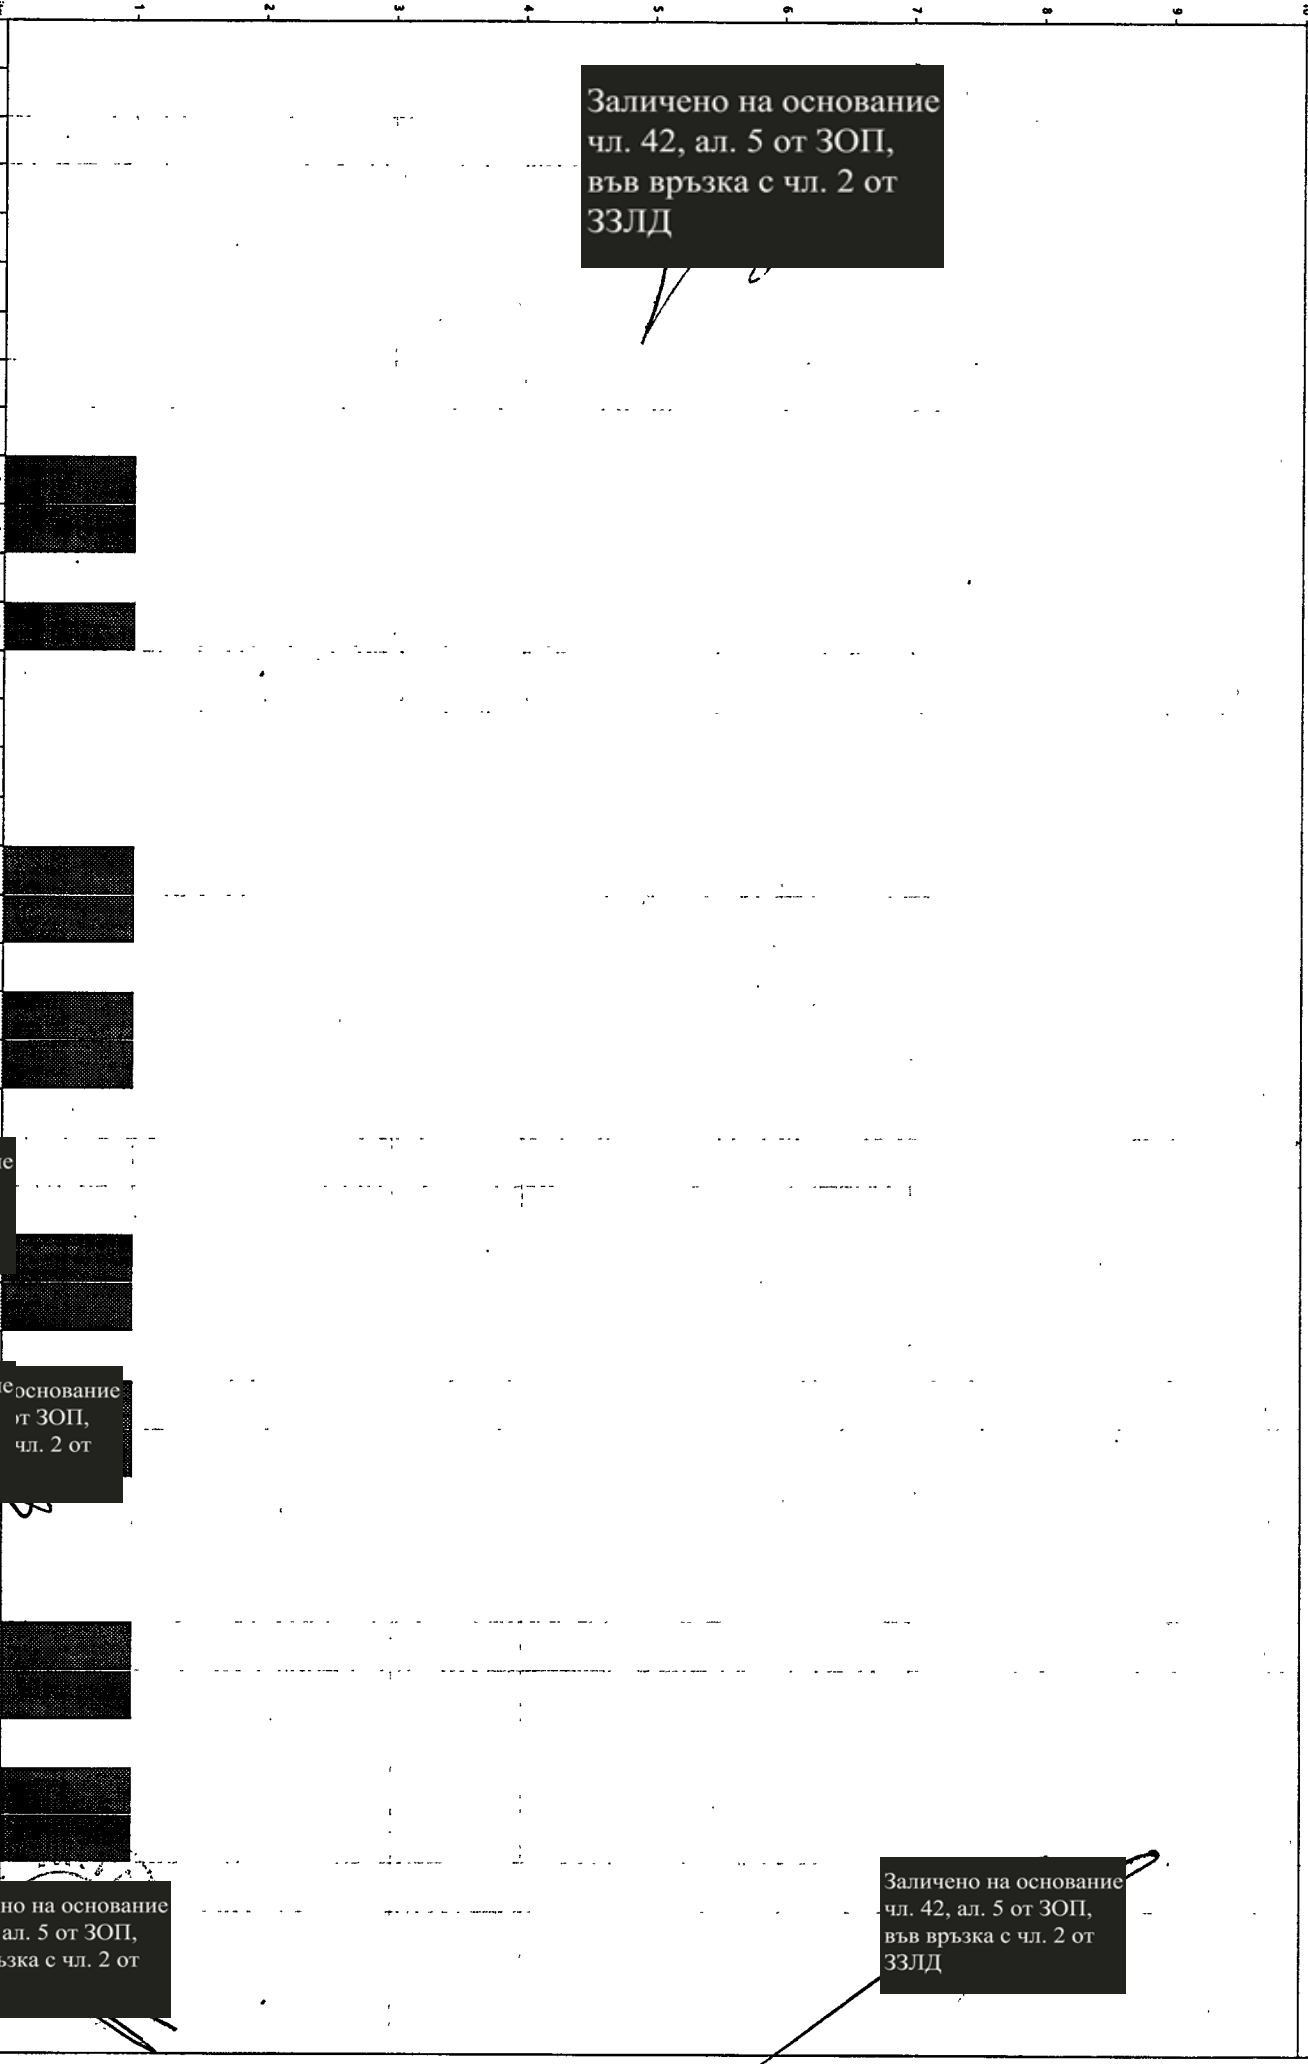

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД


Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

1:200

⑤

Улица  
Торнак станция  
Овчарска  
Ассена



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД


Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Рез. Улици

Възр. с чук  
Омиване  
Асфалт



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД


Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Асфалтово покритие  
Освободен път  
Дисциплина

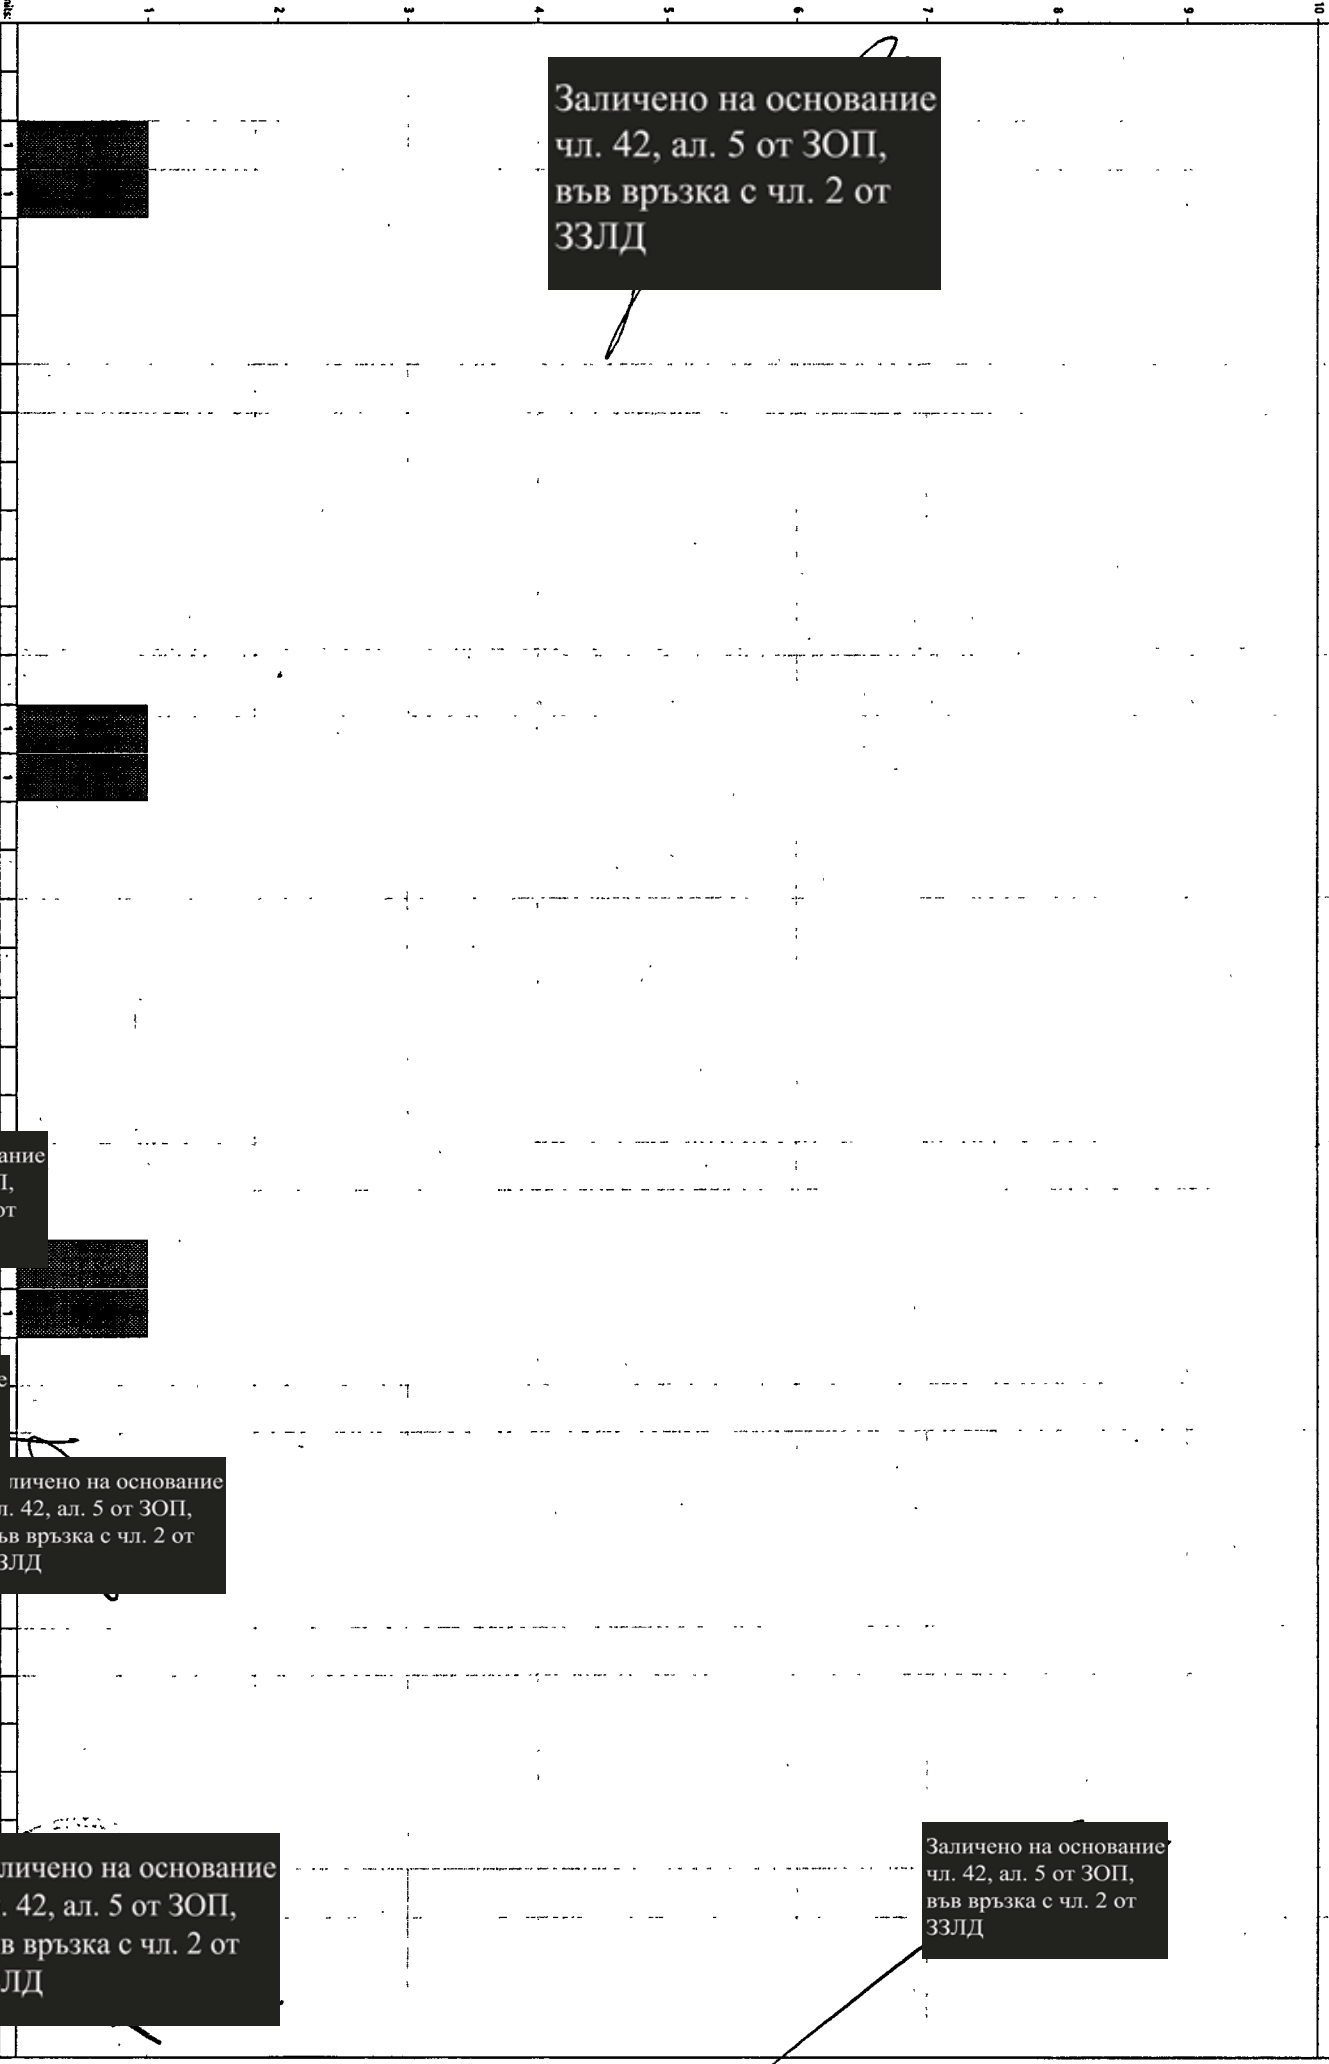

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД


532/18

Валик  
Overlapped: #####  
Акселератор: #####

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Unit  
Фигура  
Ориентационни знаци  
Absoluit

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

сно на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

### ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Учредител/уполномощеният/ата

Десислав Герданов  
*(трите имена на декларатора)*

ЕГН

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Документ по документ за самоличност

лична карта №

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

издадена на

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

г. от МВР София

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

Положението си на

Управител

*(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)*

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ 202357469

*(наименование на участника)*

в съответствие с изискванията за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“ с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“.

### ДЕКЛАРИРАМ

Да се счита за конфиденциална, информацията, съдържаща се в следната/следните конкретна част/части от нашето техническо предложение, тъй като съдържа търговски тайни\*:

Предлаганото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

Забележка: \*Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал. 2 ЗОП участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: 19.04. 2018 г.


ДЕКЛАРАТОР:

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

*(попис, печат)*  
Десислав Герданов  
*(име и фамилия)*

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД





**ИНТЕРХОЛД**

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

ЕООД



**ПРЕДЛАГАНИ**

**ЦЕНОВИ**

**ПАРАМЕТРИ**

---

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД  
1404 гр. София, бул. „България“ №73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6 /208/  
[tender@interhold.bg](mailto:tender@interhold.bg)

ДО  
ОБЩИНА СМЯДОВО

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ИНТЕРХОЛД ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ 202357469  
 със седалище Гр. София и адрес на управление Бул. „България“ 73, вх. Б, ап. Б6  
 представлявано от Десислав Герданов в качеството на управител  
 данни по документ за самоличност Л.К. № издадена на г. от МВР София  
 тел. 02 477 81 34 факс 02 477 81 34 ел.-поща tender@interhold.bg

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“.

Предлагаме да изпълним строителството предмет на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя и подадената оферта при следната обща цена:

635 037.30 лева ( Шестстотин тридесет и пет хиляди тридесет ) лева без включен ДДС  
 и седем лева и тридесет стотинки

(сума с цифри)

(сума с думи)

или

762 044,76 лева ( Седемстотин шестдесет и две хиляди ) лева с включен ДДС,  
 четиридесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки

(сума с цифри)

(сума с думи)

в това число непредвидени разходи в размер на:

12 700.75 лева ( Дванадесет хиляди и седемстотин лева и ) лева без включен ДДС  
 седемдесет и пет стотинки

(сума с цифри)

(сума с думи)

или

15 240,90 лева ( Петнадесет хиляди двеста и четиридесет лева ) лева с включен ДДС  
 и деветдесет стотинки

(сума с цифри)

(сума с думи)

Предлаганата обща цена, е крайна и окончателна цена за изпълнение на работите, включени в предмета на поръчката. В предлаганата цена са включени всички разходи за цялостно извършване на дейностите/работите, включени в предмета на поръчката, цената на вложените материали, оборудване, извършени работи и разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителните площадки по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове работи и материали (товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от възложителя места, провеждане на проби и изпитвания, отстраняване на всички недостатъци по работите и отстраняване на дефекти, проявили се през гаранционния срок и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за изпълнителя и непредвидени разходи.

Елементи на ценообразуване за видовете строителни и монтажни работи са както следва:

Средна часова ставка за ръководен персонал: [5,00] лв./час

Средна часова ставка за квалифицирани работници: [5,00] лв./час

Средна часова ставка за неквалифицирани работници: [5,00] лв./час

Допълнителни разходи върху труд [90] %.

Заличено на основание  
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
 във връзка с чл. 2 от  
 ЗЗЛД

Допълнителни разходи върху механизация [30] %.

Доставно-складови разходи [10] %.

Печалба [10] %.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образувание. Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Приложение: Остойностени количествени сметки.

Наименование на участника

ИНТЕРХОЛД ЕООД

Дата

20 / 04 // 2018

Законен представител/упълномощено лице  
(име и фамилия)

Инж. Десислав Герданов

Подпис  
(печат)

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Подобект: улица Захари Величков град Смядово  
Количествена сметка

Номер	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	м3	186.00	20.32	3779.52
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У.ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029а>>	м3	434.00	4.57	1983.38
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	190.00	32.67	6207.30
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м3	430.00	31.82	13682.60
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	186.00	9.41	1750.26
6	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 м3	1.86	940.50	1749.33
7	УПЛЪТН.ПЯСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	м3	620.00	5.92	3670.40
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	186.00	9.41	1750.26
9	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	1400.00	6.47	9058.00
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	135.00	11.01	1486.35
11	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ВОДОПР. Ф90 И МОНТАЖ НА ТРЪБА	м	732.00	99.04	72497.28
12	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕДП.ЛЕНТА Ф50 И МОНТАЖ	м	732.00	59.22	43349.04
13	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	52.00	71.02	3693.04
14	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	94.00	20.06	1885.64
15	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ ТИП 100 RC	м	732.00	20.06	14683.92
16	Доставка и монтаж тръби ф250/1.0-РЕ	м	20.00	106.42	2168.40
17	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф250РЕ	бр.	5.00	245.97	1229.85
18	Доставка и монтаж тръби ф63/1.0 - РЕ	м	5.00	13.34	66.70
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСОННИ ЧАСТИ Ф63РЕ	бр.	2.00	48.62	97.24
20	ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	1.00	48.62	48.62
21	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	м	200.00	6.57	1314.00
22	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	88.00	6.08	535.04
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	22.00	153.18	3369.96
24	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ Ф90ММ	бр.	22.00	48.50	1067.00
25	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	9.00	256.03	2304.27
26	МОНТАЖ ПК В/У СТОМ.ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	8.00	603.71	4829.68
27	МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК Ф50-БЕЗШАХТОВ	бр.	1.00	520.74	520.74
28	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф80ММ ЗА АЦ	бр.	1.00	34.53	34.53
29	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	14.00	14.51	203.14
30	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	9.00	33.61	302.49
31	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	31.00	33.61	1041.91
32	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	1100.00	0.64	704.00
33	Доставка глух фланец 80	бр.	6.00	21.64	129.84
34	Доставка глух фланец 250	бр.	2.00	113.87	227.74
35	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф80ММ	бр.	6.00	34.53	207.18
36	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА Ф250ММ	бр.	2.00	87.76	175.52
37	ШАХТА ВОДОМЕРНА 100/100СМ Н=или<2М	бр.	6.00	457.57	2745.42
38	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	42.00	52.47	2203.74
39	ФИЛТЪР 3/4"	бр.	14.00	52.47	734.58
40	РЕГУЛАТОР 3/4"	бр.	14.00	41.58	582.12
41	МАНОМЕТЪР - ВОДЕН 0.5-15bar	бр.	28.00	32.73	916.44
42	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 3/4"	м	28.00	17.79	498.12
43	ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 5 МЗ/ЧАС	бр.	5.00	96.00	480.00
44	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 3/4"	бр.	6.00	52.47	314.82
45	ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.КЦИЯ.ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	3.00	153.03	459.09
46	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	800.00	3.69	2952.00
47	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	10.50	99.61	1045.91
48	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	м	1050.00	1.90	1995.00
49	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЗЕКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1.00	238.70	238.70
50	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	4.45	1229.36	5470.65
51	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	4.45	4087.37	18188.60

СМР  
УЛ."З.ВЕЛИЧКОВ"-ВОДОПР.  
ДДС 20%  
ВСИЧКО

240279.52  
48055.90  
288335.42

4/20/2018

Подпис и печат  
/инж. Десисла

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Подобект: улица Иван Вазов град Смядово  
Количествена сметка

Номер	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	м3	380.00	20.32	7721.60
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029а>>	м3	882.00	4.57	4030.74
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	420.00	32.67	13721.40
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м3	840.00	31.82	26728.80
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	380.00	9.41	3575.80
6	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 м3	3.80	940.50	3573.90
7	УПЪЛЪТН.ПЯСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	м3	1260.00	5.92	7459.20
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	380.00	9.41	3575.80
9	НЕПЪЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2465.00	6.47	15948.55
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	273.00	11.01	3005.73
11	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	193.00	20.06	3871.58
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	12.00	71.02	852.24
13	Доставка и монтаж тръби ф160/1.0-РЕ	м	30.00	48.15	1444.50
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф160-РЕ	бр.	6.00	137.95	827.70
15	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	м	220.00	6.57	1445.40
16	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	108.00	6.08	656.64
17	Доставка и монтаж тръби ф110/1.0 РЕ	м	280.00	26.37	7383.60
18	ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	1.00	48.62	48.62
19	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	27.00	153.18	4135.86
20	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ Ф90ММ	бр.	6.00	48.50	291.00
21	МОНТАЖ МЕТАЛНА ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ Ф110ММ	бр.	21.00	56.05	1177.05
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	1.00	256.03	256.03
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф150ММ	бр.	1.00	364.93	364.93
24	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф100ММ	бр.	2.00	280.23	560.46
25	МОНТАЖ ПК В/У СТОМ.ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	4.00	603.71	2414.84
26	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф80ММ ЗА АЦ	бр.	2.00	34.53	69.06
27	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф100ММ ЗА АЦ	бр.	1.00	36.08	36.08
28	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	11.00	14.51	159.61
29	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	5.00	33.61	168.05
30	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	31.00	33.61	1041.91
31	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	750.00	0.64	480.00
32	ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ,ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	6.00	153.03	918.18
33	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	960.00	3.89	3734.40
34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	6.93	99.61	690.30
35	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	м	693.00	1.90	1316.70
36	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЗЕКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1.00	238.70	238.70
37	МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК Ф50-БЕЗШАХТОВ	бр.	1.00	520.74	520.74
38	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф110 РЕ	бр.	10.00	88.97	889.70

СМР  
УЛ.ИВАН ВАЗОВ"-ВОДОПР.  
ДДС 20%  
ВСИЧКО

125335.40  
25067.08  
150402.48

4/20/2018

Подпис  
/инж.

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Подобект: "ул. Априлско въстание"  
Количествена сметка

Номер	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	м3	430	20.32	8737.6
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029а>>	м3	1002	4.57	4579.14
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	490	32.67	16008.3
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м3	942	31.82	29974.44
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	430	9.41	4046.3
6	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 м3	4.3	940.50	4044.15
7	УПЛЪТН.ПЯСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>>	м3	1432	5.92	8477.44
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	430	9.41	4046.3
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2870	6.47	18568.9
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	311	11.01	3424.11
11	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	500	20.06	10030
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	45	71.02	3195.9
13	Доставка и монтаж тръби ф160/1.0-РЕ	м	35	48.15	1685.25
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф160-РЕ	бр.	8	137.95	1103.6
15	ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	4	48.62	194.48
16	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	м	260	6.57	1708.2
17	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	128	6.08	778.24
18	Доставка и монтаж тръби ф75/1.0 РЕ	м	20	17.07	341.4
19	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф75 РЕ	бр.	1	55.07	55.07
20	ТРОТОАР,КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	32	153.18	4901.76
21	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ Ф90ММ	бр.	32	48.50	1552
22	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф80ММ	бр.	8	256.03	2048.24
23	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА Ф150ММ	бр.	1	364.93	364.93
24	МОНТАЖ ПК В/У СТОМ.ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	5	603.71	3018.55
25	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф80ММ ЗА АЦ	бр.	2	34.53	69.06
26	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА Ф100ММ ЗА АЦ	бр.	2	36.08	72.16
27	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	16	14.51	232.16
28	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	5	33.61	168.05
29	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	40	33.61	1344.4
30	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	900	0.64	576
31	ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ,ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	6	153.03	918.18
32	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	1000	3.89	3890
33	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	8.09	99.61	805.84
34	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО Ф102 <<09-43-001>>	м	809	1.90	1537.1
35	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЗЕКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1	238.70	238.7

СМР  
УЛ."АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ"-I ЧАСТ-ВОДОПР.  
ДДС 20%  
ВСИЧКО

4/20/2018

142736  
28547.19  
17283.14

Под  
/и  
Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Подобект: улица Райна Княгиня град Смядово

Количествена сметка

Номер	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М -30% <<01-01-035>>	м3	375	20.32	7620
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ-70% <<01-04-029а>>	м3	875	4.57	3998.75
3	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	415	32.67	13558.05
4	ЗАСИПВАНЕ С ЧАКЪЛ НА ТРЪБОПРОВОДИ	м3	835	31.82	26569.7
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	375	9.41	3528.75
6	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-057>>	100 м3	3.75	940.50	3528.88
7	УПЛЪТН.ЛЯСЪК И ЧАКЪЛ НА ПЛАСТОВЕ 25до40СМ <<01-01-063>> <<01-01-063>>	м3	1250	5.92	7400
8	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ ОТ КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-079>>	м3	375	9.41	3528.75
9	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-011>>	м2	2450	6.47	15851.5
10	ПРЕВОЗ НА ПРЪСТ НА 15КМ	курс	271	11.01	2983.71
11	Доставка и монтаж тръби ф90/1.0 РЕ	м	474	20.06	9508.44
12	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф90 РЕ	бр.	35	71.02	2485.7
13	Доставка и монтаж тръби ф160/1.0-РЕ	м	20	48.15	963
14	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ф160-РЕ	бр.	3	137.95	413.85
15	Доставка и монтаж тръби ф32/1.0-РЕ	м	310	6.57	2036.7
16	ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА Ф32 РЕ	бр.	104	6.08	632.32
17	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф32-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	26	153.18	3982.68
18	МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА В/У РЕ ТРЪБИ ф90ММ	бр.	26	48.50	1261
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	1	256.03	256.03
20	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф150ММ	бр.	1	364.93	364.93
21	МОНТАЖ ПК В/У СТОМ.ТРЪБИ 80ММ/2В-НАДЗЕМЕН	бр.	5	603.71	3018.55
22	МОНТАЖ ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ф80ММ ЗА АЦ	бр.	2	34.53	69.06
23	Доставка и монтаж глух фланец ф150	бр.	1	82.50	82.5
24	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф150ММ	бр.	1	62.74	62.74
25	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ	бр.	14	14.51	203.14
26	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	5	33.61	168.05
27	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	39	33.61	1310.79
28	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	750	0.64	480
29	ДЪРВ.ДЕКОР.МОСТЧЕ С ШИРИНА 1М ВКЛ.К-ЦИЯ ДЮШЕМЕ И ПАРАПЕТ С ШАРКА ОТ ИГЛ.М-Л	м	6	153.03	918.18
30	НАПРАВА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	950	3.89	3695.5
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	6.84	99.61	681.33
32	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО 100до300 АТМ. ДО ф102 <<09-43-001>>	м	684	1.90	1299.6
33	ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ-ЕКЗЕКУТИВ И АДМИНИСТРИРАНЕ	бр.	1	238.70	238.7
34	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	0.75	1229.36	922.02
35	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	100 м2	0.75	4087.37	3065.53

СМР  
УЛ."РАЙНА КНЯГИНЯ"-ВОДОПР.  
ДДС 20%  
ВСИЧКО

126886.43  
25367.29  
152023.72

4/20/2018

Подпис и печат  
/инж. Десислава

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

**СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Подписаният **Десислав Герданов**

лична карта № **3331Д**, издадена на **31.01.2014** г. от МВР София, с ЕГН **3331Д**

в качеството си на управител

на участник „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД

със седалище и адрес на управление гр.София, 1404,Община Триадница, бул. „България“ №73, вх.Б, ет.2, ап.Б6-208

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в открита процедура с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово“

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на ..... (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. Технически ръководител и Координатор по безопасност и здраве: Венцислав Веселинов	Средно специално Техникум по строителство гр. Благоевград Специалност: „Строителство и архитектура“, Квалификация „Строителен техник“ 1996г. – 2001г. Диплома: Серия В-01 №2201937, рег. № 327907/29.06.2001г. Варненски свободен университет „Черноризец храбър“ Бакалавър Строителство на сгради и съоръжения Строителен инженер Диплома №032772 10г.	Строителен квалификация АД Завършен курс за „Координатор безопасност и здраве“ по време на проектирането координатор безопасно и здраве по време на строителството“ Удостоверение №89/11.01.2019г.	опит 12.08.2014г. до момента „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД Технически ръководител Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични условия на работа в София и страната. 02.04.2012г. до 01.10.2014г. „Танел“ ООД Техник строителство и архитектура Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични и условия на работа в 42 Проверката се извършва от възлагачия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; София и страната 15.02.2006г. до 01.07.2010г. „Танел“ ООД





			<p>Организация, управление и контрол по изпълнение на обекти, свързани със специфични и условия на работа в София и страната Опит на обекти в сферата:</p> <p>1., „Ремонт и възстановяване на ограда към ул. „Средна Гора“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Странджа“, ремонт на източна фасада към ул. „Странджа“ и довършване ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ „Уилям Гладстон“, УПИ-1-„за Училище“, кв. 157, м. „Зона Б-3“, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ №68“, Сградата на училището, представлява недвижима културна ценност, обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“</p> <p>2., „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура „Гунджа“ по обособена позиция 2 „Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, находящи се в УПИ XIV-123, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево“</p> <p>3., „Вътрешно преустройство и ремонт на IV етаж от Административна сграда за регионален офис на КОНПИ, гр. Пловдив, ул. Санкт Петербург № 67“.</p>
<p>3. Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството:</p> <p>Росен Босев – на трудов договор</p>	<p>Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, гр. София</p> <p>Инженер по управление на проекти в строителството магистър Управление на проекти в строителството Диплома № 43268/2015г.</p> <p>Университет по Архитектура, Строителство и</p>	<p>„Строителна квалификация“ ЕАД</p> <p>Удостоверение №02761/19.09.2017г.</p>	<p>Контрол по качеството, контрол върху изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.</p> <p>9г. опит</p> <p>2015г. До момента „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД Главен инженер, контрол по качеството</p> <p>Изпълнени обекти като контрол по качество: 1 „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на</p>



Геодезия, гр. София  
Строителен инженер -  
магистър

Строителство на сгради  
и съоръжения (ССС)  
Диплома № 37888/2010г.

Службата по геодезия,  
картография и кадастър (СГКК)  
- Пловдив, находящи се на  
партер и първи етаж в  
административна сграда в гр.  
Пловдив, пл. „Съединение“ №  
3” 2. „Въвеждане на мерки за  
енергийна ефективност в  
многофамилни жилищни сгради  
блок №40А, №41, №41А, №42“,  
намиращи се на адрес: гр.  
Кюстендил, кв. „Румена  
Войвода“, бл.40А, 41, 41А, 42 3.  
„Въвеждане на мерки за  
енергийна ефективност в  
многофамилна жилищна сграда  
блок №91“, намираща се на  
адрес: гр. Кюстендил,  
кв. „Запад“, бл.91 4.  
„Въвеждане на мерки за  
енергийна ефективност в  
многофамилни жилищни сгради  
блок № 46 и № 47“, намиращи  
се на адрес: гр. Кюстендил, кв.  
„Румена Войвода“, бл.46,47  
04.2014 – 10.2015г. „Сиенит  
Строителна Група“ ЕООД  
Ръководител проекти и Експерт  
контрол по качеството -  
Ръководител на проект на обект:  
Сграда на СУ „Св. Климент  
Охридски“ в незавършен строеж  
в УПИ I кв. 6 „Б“, м НПЗ  
„Кърво“ район „Младост“, гр.  
София  
Координиране и ръководене на  
проекта, взимане на решения,  
договаряне в подизпълнители и  
доставчици, решаване на  
проблеми, контрол на  
изпълнените СМР, изготвяне на  
финансови отчети и парични  
потоци, изготвяне на линейни  
графици. • Технически  
ръководител на обект: „Етажен  
паркинг“ реализиращ се по  
проект „Научно технологичен  
парк“ който се изпълнява по ОП  
„Развитие на  
конкурентоспособността на  
българската икономика“ 2007-  
2013, приоритетна ос 1:  
„Развитие на икономика,  
базирана на знанието и  
иновационните дейности“.  
07.2011-04.2014 „Сиенит“ ООД  
Технически ръководител на



		<p>обект: Сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ в незавършен строеж в УПИ I, кв.6 „Б“, м НПЗ „Къро“, район „Младост“ гр. София“  Осъществява непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.  07.2010-07.2011 „Сиенит“ ООД  Технически ръководител на обекти: •Метро София II метродиаметър от км +1.300 до км +1.800 – стр. конструкции метротунел по открит способ, шлицови стени и хидроизолации •Метро София II метродиаметър от км +1.800 до км +3.1000 – стр. конструкции метротунел по открит способ, метротунел и подземен паркинг по „Милански способ“ –740м ВИ, шлицови стени, хидроизолации и преустройство инфраструктура.  Осъществява непосредствено оперативно – стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.  07.2008-12.2008  „Булмикс 97“ ЕООД  Технически ръководител на обект: Жилищна сграда с търговски площи и подз. Паркинг, ул. Екатерина Ненчева, кв. Витоша– всички части Осъществява непосредственото оперативно – стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект.</p>
		<p>Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД</p>

Дата: 21.01.2019г.

Декларатор: ..

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД



**ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА на ГАРАНЦИЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕ в ПОЛЗА на ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

**ПОЛИЦА № 0192823/10.01.2019**

Предложение за застраховане Q 0102296

**I. СТРАНИ**

**1.1. Застраховател / Гарант:**

"Чертасиг - застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946, седалище и адрес на управление: град София, СО-район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ №26-28-30, бл.2, ет.4, e-mail: office\_bg@certasig.bg, представлявано от Николай Генчев – управител, клон на Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – дружество, регистрирано в Република Румъния, единен регистрационен код 12408250, адрес на управление: Румъния, Букурещ, сектор 1, ул. „Николае Карамфил“ №61Б, представлявано от Мария Рангелова, лиценз за застрахователна дейност на ASF: RA-021/2003.

**1.2. Застраховач / Наредител, наричан „Изпълнител“ за целите на тази полица:**

ИНТЕРХОЛД ЕООД с ЕИК 202357469 и седалище и адрес на управление: България, гр. София 1404, бул. „България“ № 73, вх. Б, ет. 2, ап. ББ, представлявано от Десислав Герданов – управител.

**1.3. Застрахован / Бенефициер, наричан „Възложител“ за целите на тази полица:**

ОБЩИНА СМЯДОВО, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000931657, с адрес: гр.СМЯДОВО пл. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ № 2, представлявана от Иванка Николова – Кмет.

С посредничеството на: Брокер Инс ООД, ЕИК 121773065 с адрес: София, ул. Кърниградска 3, представлявано от Румен Стайков и Стефан Енчев.

**1.4. Детайли за договора, сключен между Застраховачия и Застрахования (Договора):**

Договор №: [ще бъде уточнен след подписването]

Стойност на Договора:  
635 037.30 лв. (без ДДС)

Срок на договора:  
съгл. чл.3 от Договора

**Предмет на Договора:** Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово.

ИНТЕРХОЛД ЕООД е определено за изпълнител на обществена поръчка с номер в АОП 00627-2018-0002.

Клаузи от Договора относно задължения на Застраховачия (Гарантирани Задължения): Под Гарантирани задължения следва да се разбират всички задължения по договора, посочен в т.1.4 от настоящия Договор за застраховка.

**1.5. Гаранция (застрахователна сума)**

По искане на Застрахования, "Чертасиг - Застрахователно и презастрахователно дружество АД – клон България" КЧТ, ЕИК: 203318946 в качеството на Застраховател, неотменимо се задължава, в случай на неизпълнение на Гарантираните задължения от Застрахования спрямо Застрахования, да плати на Застрахования вместо Застраховачия, всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума, при получаване от Застрахователя на писмено искане (претенция) от Застрахования и писмено становище (към искането), твърдящо че:

- ✓ Застраховачият не изпълнява задълженията си по Договора (описан по-горе), придружено с описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение

1.5.1. Правото да получи гаранцията по тази застраховка е единствено в полза на Застрахования и не може да бъде прехвърлено на друго лице.

За Застрахователя:  
/Николай Генчев/

За Застраховачия

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

За Застрахования

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



**II. ДЕТАЙЛИ НА ПОКРИТИЕТО (ГАРАНЦИЯТА)**

**2.1. Застрахователна сума (сума на гаранцията): 19,051.12 (словом: деветнадесет хиляди и петдесет и един и 0.12 лева) лева, представляваща 3.00% от стойността на Договора без ДДС.**

**2.2. Срок на застраховката (валидност на гаранцията):**

Начална дата: 0.00 часа на **11.01.2019 г.**

Крайна дата: 24.00 часа на **01.07.2019 г.**

**III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ**

**3.1. застрахователна премия:**

400.07 лева

2% данък върху застрахователната премия:

8.00 лева

**Общо дължимата сума:**

**408.07 лева** (четиристотин и осем и 0.07 лева)

**3.2. Застрахователната премия е дължима изцяло и платима преди началната дата на полицата.**

**IV. УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕ**

**4.1. Настоящата застраховка на гаранция представлява твърд и неотменим ангажимент, поет от Застраховачия и Застрахователя относно плащането в полза на Застрахования на обезщетение в размера на застрахователната сума в случай, че Застраховачият не изпълни или изпълни неподходящо (от гледна точка на количеството, качеството или на договорения период) Гарантираните задължения.**

**4.2. На основание Полицата Застрахователят се задължава да плати на Застрахования определената застрахователна сума (гаранция) при неизпълнение на Гарантираните задължения от страна на Застраховачия. Размерът на застрахователната сума се намалява пропорционално със стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата Полица.**

**4.3. При ангажиране отговорността на Застрахователя по тази Полица, Застраховачият е длъжен да възстанови на Застрахователя напълно сумите, платени от Застрахователя на Застрахования вместо Застраховачия, който е в неизпълнение на свое задължение, произтичащо от Договора.**

**V. ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ)**

**5.1. Застрахователят ще извърши плащането на обезщетението на Застрахования при първото предявяване на претенция за плащане от страна на Застрахования.**

**5.2. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава стойността на уговорените неустойки в Договора, съответстващи на неизпълнението на Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в Полицата застрахователна сума или нейния към момента на предявяването актуален размер съгласно т. 4.2 по-горе.**

**5.3. Заедно с претенцията за плащане Застрахованият предава на Застрахователя декларация, в която се уточняват задълженията по Договора, които не са спазени от Застраховачия, както и кратко описание на договорната вина на Застраховачия и определяне на действителната стойност на понесената щета.**

**5.4. Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицата.**

**5.5. Плащането на застрахователното обезщетение (гаранцията) се извършва в срок до 15 работни дни от получаване от Застрахователя на претенцията и документите съгл. т.5.3., по банкова сметка, посочена от Застрахования. Обезщетението се плаща във валутата, в която е посочена застрахователната сума в Полицата или в лева по курса на Българската Народна Банка към датата на плащане.**

**VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ**

**6.1. Застраховачият ще бъде поставен по право в закъснение с оглед на задължението за плащане, считано от датата на получаване от страна на Застрахователя на уведомление чрез всякакви информационни средства, които гарантират доказване на уведомлението, относно изплащането на Застрахования на застрахователното обезщетение. Застраховачият се отказва безвъзвратно от правото да оспорва под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването от страна на Застрахователя на правото му на обезщетение.**

За Застрахователя:  
/Николай Генчев/

За Застраховачия: Заличено на основание За Застрахования

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



6.2. В случай, че Застрахователят е сдружение, членовете на сдружението отговарят солидарно пред Застрахователят що се отнася до гореспоменатото право на обратен иск.

## VII. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

7.1. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:

- 7.1.1. вреди, причинени на Застрахования в следствие изменение на основния Договор, при условие, че не е постигнато съгласие за изменение на договора за застраховка (гаранция) по реда на Раздел IX Изменение на договора т.9.2;
- 7.1.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите на Договора;
- 7.1.3. вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестриране, разрушаване или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на власт);
- 7.1.4. вреди, покрити по други застраховки;
- 7.1.5. разходи, по повод и във връзка с разрешаване посредством съответна инстанция (съдебна/арбитражна) на спор между Застрахования и Застрахователя.

## VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАЩИЯ

8.1. Застрахователят е длъжен:

- 8.1.1 да представи на Застрахователя копие от подписания Договор най-късно три дни след датата на подписването му, както и всички документи, необходими за определяне на покритите (гарантирани) задължения на Застрахователя по Договора;
- 8.1.2. да снабди Застрахователя с всякакви финансови, счетоводни и/или търговски документи, необходими за изчисляване на застрахования риск и да осигури достъп на представители на Застрахователя до седалището си / местоизвършването на дейността / търговски площи за оценка на неговата платежоспособност;
- 8.1.3. да гарантира пълното припокриване на всички клаузи и условия от Проекта на Договора, предоставен при издаването на полицата с Договора съгласно т. 8.1.1.
- 8.1.4. да плати изцяло дължимата застрахователна премия;
- 8.1.5. да уведомява Застрахователя в срок до 2 (два) дни за всяка промяна в данните, деклариран при сключване на застраховката;
- 8.1.6. да положи дължимата грижа за изпълнение на задълженията си, поети с Договора, сключен със Застрахования, в срок и при уговорените условия;
- 8.1.7. при поискване от Застрахования да изпълни надлежно своите задължения по Договора да уведомява Застрахователя по негово искане, за изпълнението на Договора, да потвърждава по надежден начин информацията и да осигури достъп на представители на Застрахователя до местата, където се изпълняват задълженията по Договора;
- 8.1.8. да не изменя Договора, сключен със Застрахования, а така и задълженията, покрити по Полицата, без предварително уведомяване на Застрахователя и неговото одобрение. В случай, че тези промени могат да изменят риска за Застрахователя, поет с Полицата, последната при съгласие на Застрахователя, ще бъде изменена и ще се сключи допълнително споразумение (добавък), с плащане на допълнителна премия;
- 8.1.9. да уведомява Застрахователя относно всеки проблем, възникнал в отношенията със Застрахования, относно изпълнение на задълженията по Договора, който може да породи плащане/претенция за обезщетение съгласно клаузите на Полицата;
- 8.1.10. да уведомява Застрахователя относно всяка претенция за плащане, получена от Застрахования по повод задълженията, покрити с Полицата, както и за всички възникнали проблеми;
- 8.1.11. в случай, че в момента на претенцията за плащане, Застрахователят е във временна неплатежоспособност, той трябва да положи всички усилия, за да осигури и запази всички ликвидни парични средства, придобити в следващ период в сметки и/или в брой, за да плати задълженията си към Застрахования и/или Застрахователя, освен ако има приоритетни задължения, определени в закон. Плащания на работници/служители, данъци към държавата);

За Застрахователя:  
/Николай Генчев/

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

За Застрахователя:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

За Застрахования:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



8.1.12. да изпълнява точно всички задължения, съгласно настоящата Полица.

#### IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

9.1. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на сроковете и условията на Договора, което може да увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застрахователя в случай на вина, или може да продължи срока на Договора.

9.2. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за изменението на Полицията (поради изменение на Договора) ще се извърши на основание искане от Застрахователя и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицията, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на общото решение на Застрахователя и Застрахования за необходимост от промяна в Договора.

#### X. ВСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ПРАВАТА НА ЗАСТРАХОВАНИЯ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ (ГАРАНЦИЯ) ПО ПОЛИЦАТА

10.1. С частичното или пълно плащане на гаранцията вместо Застрахователя, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, като кредитор, срещу Застрахователя и се суброгира срещу Застрахователя, като причинител на вредата.

10.2. Застрахованият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на гаранцията в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване от Застрахователя на уведомлението от Застрахователя за плащане на сума на гаранцията на Застрахования.

10.3. При неизпълнение на задължението на Застрахователя по предходната точка, Застрахователят ще упражни правата си съгласно условията на тази Полица.

10.4. Застрахованият се задължава да изпълни всички правни и фактически действия за реализиране на правата на Застрахователя спрямо Застрахователя, включително да предостави на Застрахователя съответните документи.

#### XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всяко съобщение на Застраховател или Застрахован, свързано със застраховката следва да бъде изпратено на адреса и/или адреса на електронна поща (e-mail) на Застрахователя, посочен в Полицията.

11.2. Всяко съобщение на Застрахователя към Застраховател или Застрахован се изпраща на посочените в Полицията адрес и/или адрес на електронна поща (e-mail). При сключване на застраховката Застрахователят и Застрахованият заявяват и адрес на електронна поща (e-mail), на които ще получават съобщения, включително за промени в условията на застраховката, относно размера на застрахователната премия и други. Застрахователят и Застрахованият са длъжни незабавно писмено да уведомят Застрахователя за промяна на указаните в Полицията адрес и/или в заявения e-mail и да съобщят на Застрахователя новия си адрес/e-mail. До получаване на съобщението за промяна на адреса/e-mail от страна на Застрахователя, съответните съобщения се изпращат до адреса/e-mail на Застрахователя или Застрахования, посочени в Полицията, като същите се смятат за връчени и получени от Застрахователя или Застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.

11.3. По тази застраховка не се дължат такси и други плащания, освен данък върху застрахователната премия в размер на 2% съгласно Закона за данък върху застрахователните премии, посочен в Полицията.

11.4. Всички спорове, които не са разрешени по взаимно съгласие, произтичащи от тази застраховка или свързани с нея, включително и тези, произтичащи от или във връзка с нейното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, се отнасят за решаване пред компетентния съд в град София. Приложимо по настоящата застраховка е българското законодателство.

11.5. С настоящото Застрахователят уведомява ползвателите на застрахователни услуги, че:

- ✓ Застрахователят е администратор на лични данни, обработвани за целите, свързани с изпълнението на договора и на застрахователното правоотношение, с важен обществен интерес; с изпълнение на законови задължения, както и за цели, свързани с неговите законни/легитимни интереси;
- ✓ Застрахователят има самостоятелно законово основание да обработва лични данни, което не се основава и не зависи от съгласието на засегнатите субекти на данни;

За Застрахователя:  
/Николай Генчев/

За Застрахователя

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Застрахования

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД



- ✓ информация за начина, по който Застрахователят обработва и защитава лични данни може да бъде намерена в Политиката за конфиденциалност на Застрахователя, публикувана на <https://www.certasig.ro>;
- ✓ предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето на данни е основание Застрахователят да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай, че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните интереси на Застрахователя;
- ✓ Застрахователят гарантира упражняването на правата на субектите на данни, уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отменящ Директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на личните данни) и в приложимото в Република България законодателство в областта на защита на данните.

11.6. Страните се съгласяват, че ще обработват лични данни на застраховани лица/свои служители, разкрити/предоставени/предавани между тях във връзка с или по повод на настоящия договор, като съвместни администратори и заявяват и потвърждават, че при обработването на лични данни ще спазват изискванията на приложимото в Република България законодателство в областта на защитата на данните (включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и отменящ Директива 95/46/ЕС (Общ регламент за защита на личните данни)).

11.7. С подписването на настоящото, Страните съвместно определят средствата, с които ще бъдат събирани/разкривани/предоставяни личните данни, необходими за сключването и изпълнението на договора, а именно: чрез писмени документи, изпращани по пощата или предавани на ръка; чрез електронни документи, изпращани по електронен път с имейл като криптирани прикачени файлове, или съхранявани върху технически носители на информация като криптирани файлове; по телефон, както и съвместно определят целите на обработването, а именно: изпълнението на договора и на застрахователното правоотношение, за нуждите на важен обществен интерес; за изпълнение на законови задължения и за защита на законни/легитимни интереси на Застрахователя.

11.8. Страните се задължават да предоставят на субектите на данни, с които осъществяват контакт, задължителната информация по чл.13 и чл.14 от Общия регламент относно защитата на данните, а именно данни относно дейността по съвместно обработване на лични данни, в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Посочената информация може да бъде предоставена чрез Политика за поверителност на всяка от Страните.

11.9. Страните изрично се съгласяват, че във връзка с обработването на данни, всяка от Страните ще носи отговорност пред засегнатите субекти на данни и самостоятелно ще контактува с тях.

11.10. Със сключване на настоящата застраховка, Застрахованият и Застраховачият дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани и предоставяни от Застрахователя на трети лица (включително на лица, чието място на пребиваване не е страна-членка на Европейския съюз или на държава-членка на Европейското икономическо пространство) за нуждите на застраховката и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

Настоящата застраховка (Полица) се сключи в три оригинални екземпляра, които са разпределени, както следва: един за Застраховачия, един за Застрахования и един за Застрахователя.

За Застрахователя:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

За Застрахования:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД

За Застраховачия:

Заличено на основание  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,  
във връзка с чл. 2 от  
ЗЗЛД
